

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu

UVOD

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu izvršen je na osnovi sljedećih dokumenata:

- Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu kojeg je Gradsko vijeće Grada Gospića usvojilo na sjednici održanoj 29. studenog 2018. godine, a objavljen je u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ broj 10/2018,
- Odluke o Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu koju je Gradsko vijeće Grada Gospića usvojilo na sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, a objavljena je u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ broj 11/2018,
- Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu koju je Gradsko vijeće Grada Gospića usvojilo na sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine, a objavljena je u „Službenom vjesniku Grada Gospića“ broj 12/2019.

Program građenja komunalne infrastrukture donesen je temeljem članka 67. stavaka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 98/19).

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.409.882,00 kuna za realizaciju sljedećih pod programa:

1. nerazvrstane ceste,
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
3. javne zelene površine,
4. građevine i uređaji javne namjene,
5. javna rasvjeta,
6. groblja,
7. gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom,
8. energetska učinkovitost.


U 2019. godini za realizaciju gore navedenih pod programa utrošeno je ukupno 9.022.325,03 kuna, što čini 86,67%, u odnosu na plan.

U nastavku je prikazana realizacija svakog pod programa tablično i grafički.


1. NERAZVRSTANE CESTE

		A	B	
R. br.	Gradnja nerazvrstanih cesta	Planza 2019. godinu	Realizacija plana za 2019. godinu	Indeks (B/A)*100
1.1.	Izgradnja ceste prema odlagalištu otpada Rakitovac	1.220.811,00 kn	1.217.541,48 kn	99,73
1.2.	Izgradnja ceste na relaciji Vaganac-Kruščica	745.133,00 kn	535.742,22 kn	71,90
1.3.	Rekonstrukcija dijela ceste Barlete	428.131,00 kn	428.130,24 kn	99,99
1.4.	Izgradnja i/ili rekonstrukcija cesta i	550.000,00 kn	555.132,31 kn	100,93


	mostova			
1.5.	Najam programa za evidenciju nerazvrstanih cesta	110.000,00 kn	122.170,00 kn	111,06
1.6.	Priprema i izrada projektne dokumentacije za ceste	50.000,00 kn	9.250,00 kn	18,50
UKUPNI RASHODI ZA GRADNJU NERAZVRSTANIH CESTA		3.104.075,00 kn	2.867.966,25 kn	92,39
Izvor sredstava za ostvarivanje programa građenja nerazvrstanih cesta		Izvori sredstava planirani za 2019. godinu	Izvori sredstava realizirani u 2019. godini	Indeks (B/A)*100
Izvor 1.1. Prihod od poreza		20.000,00 kn	14.580,00 kn	72,90
Izvor 1.4. Predfinanciranje EU projekata		788.000,00 kn	784.730,20 kn	99,59
Izvor 4.3. Doprinos za šume		321.500,00 kn	321.500,28 kn	100,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		90.000,00 kn	107.590,00 kn	119,54
Izvor 5.4. Tekuće pomoći		600.000,00 kn	564.382,31 kn	94,06
Izvor 5.6. Prijenos sredstava EU		745.133,00 kn	535.742,22 kn	71,90
Izvor 6.3. Donacija trgovačkih društava i ostalih subjekata		428.131,00 kn	428.130,24 kn	100,00
Izvor 7.2. Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		111.311,00 kn	111.311,00 kn	100,00
UKUPNI IZVORI ZA GRADNJU NERAZVRSTANIH CESTA		3.104.075,00 kn	2.867.966,25 kn	92,39

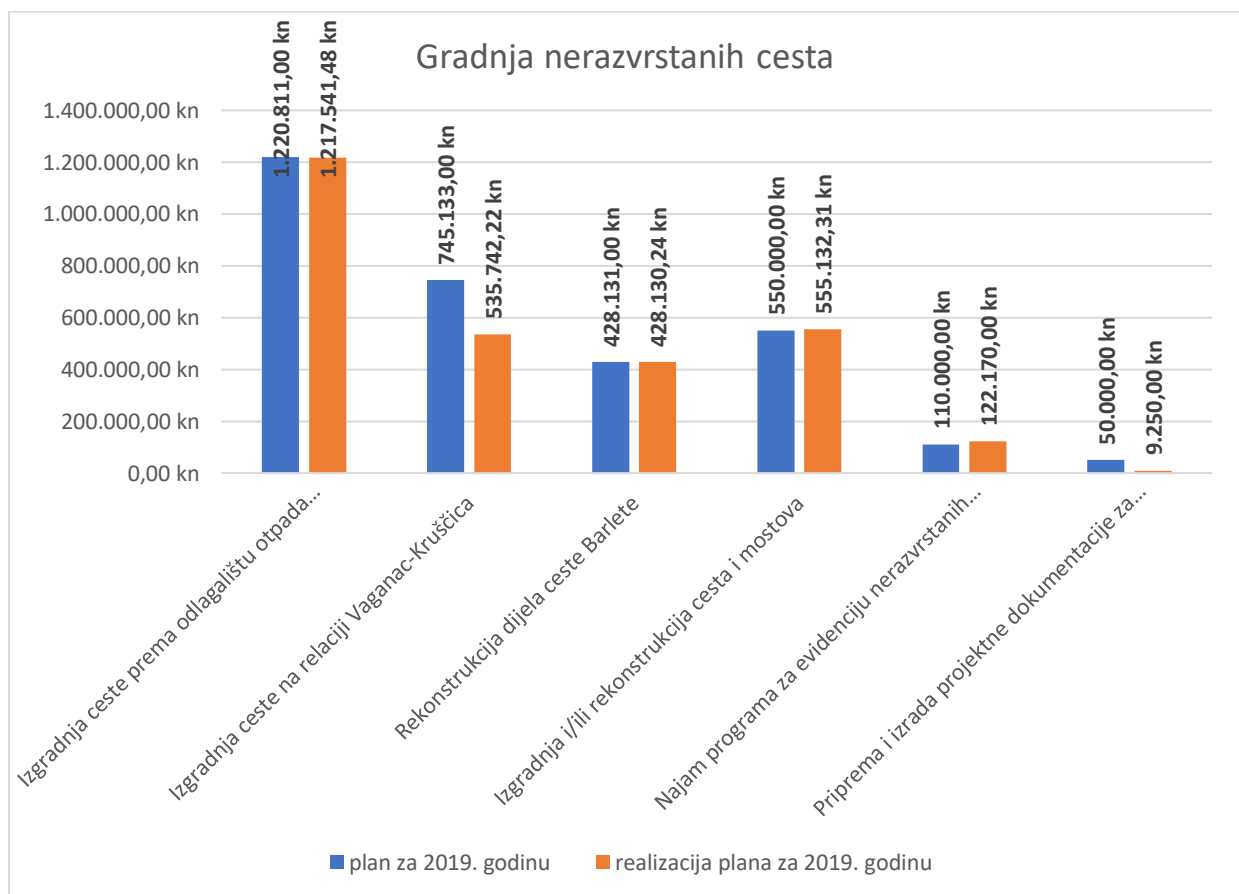


Gradnja nerazvrstanih cesta

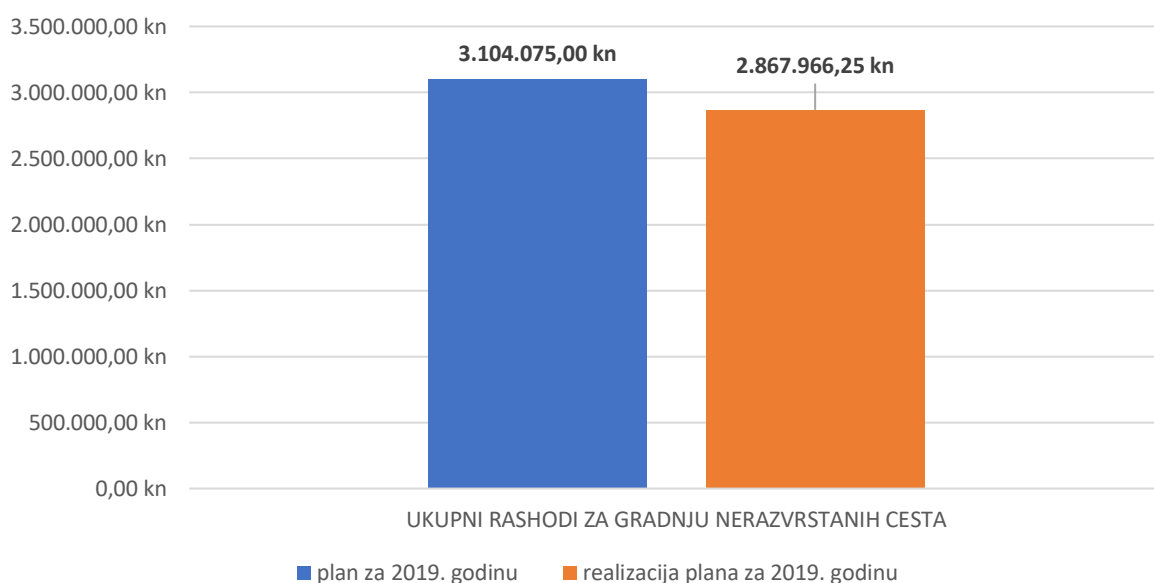

Izvor sredstava za ostvarivanje programa građenja nerazvrstanih cesta

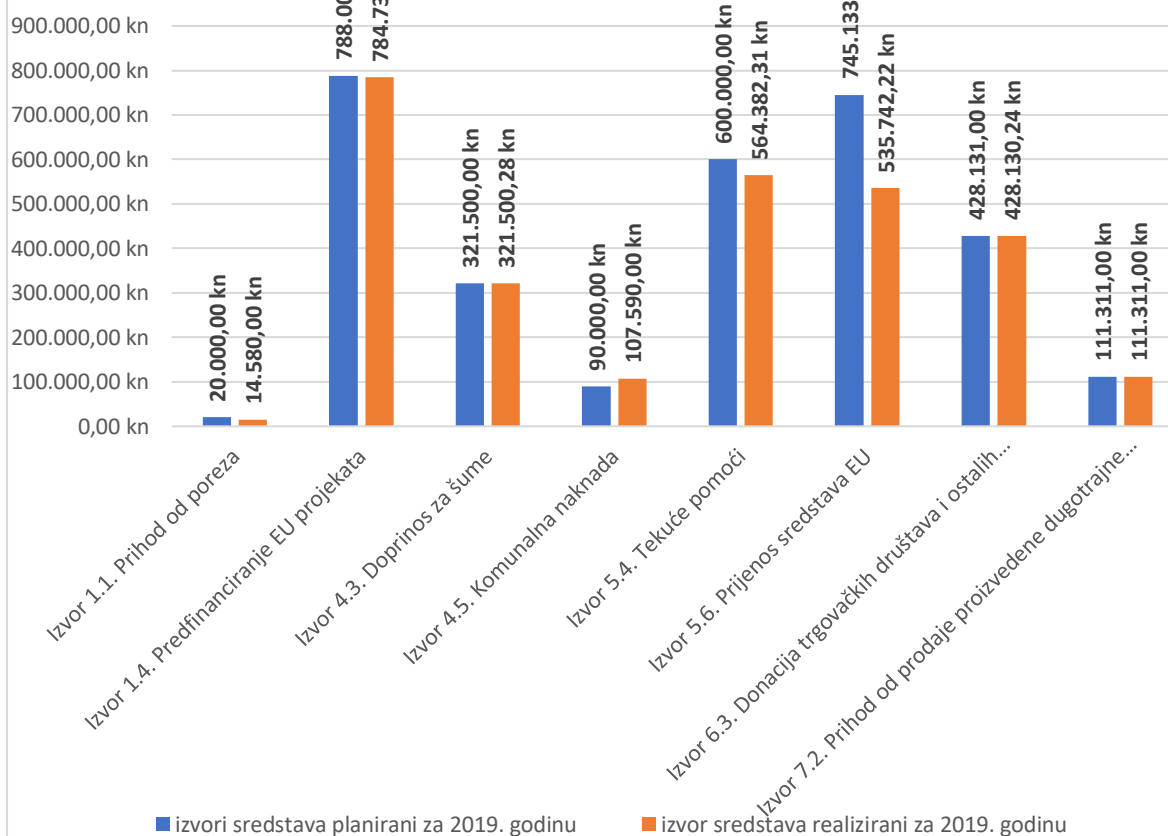


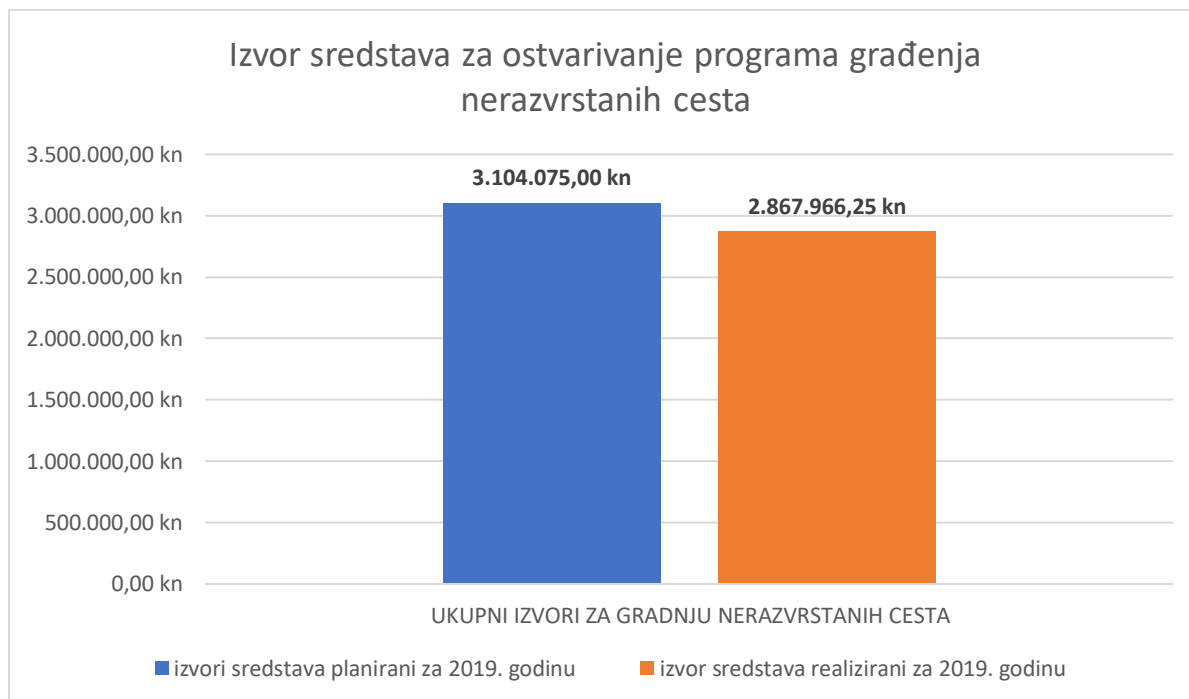


2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

		A	B	
R. br.	Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	Plan za 2019. godinu	Realizacija plana za 2019. godinu	Indeks (B/A)*100
2.1.	Rekonstrukcija trga u Ličkom Osiku	43.000,00 kn	42.187,50 kn	98,11
2.2.	Gradnja nogostupa do osnovne škole dr. Jure Turić	880.419,00 kn	868.645,31 kn	98,66
UKUPNI RASHODI ZA GRADNJU JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA		923.419,00 kn	910.832,81 kn	98,64
Izvor sredstava za ostvarivanje programa gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		Izvori sredstava planirani za 2019. godinu	Izvori sredstava realizirani u 2019. godini	Indeks (B/A)*100
Izvor 4.4. Komunalni doprinos		216.125,00 kn	203.539,68 kn	94,18
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći		707.294,00 kn	707.293,13 kn	100,00
UKUPNI IZVORI ZA GRADNJU JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA		923.419,00 kn	910.832,81 kn	98,64


Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

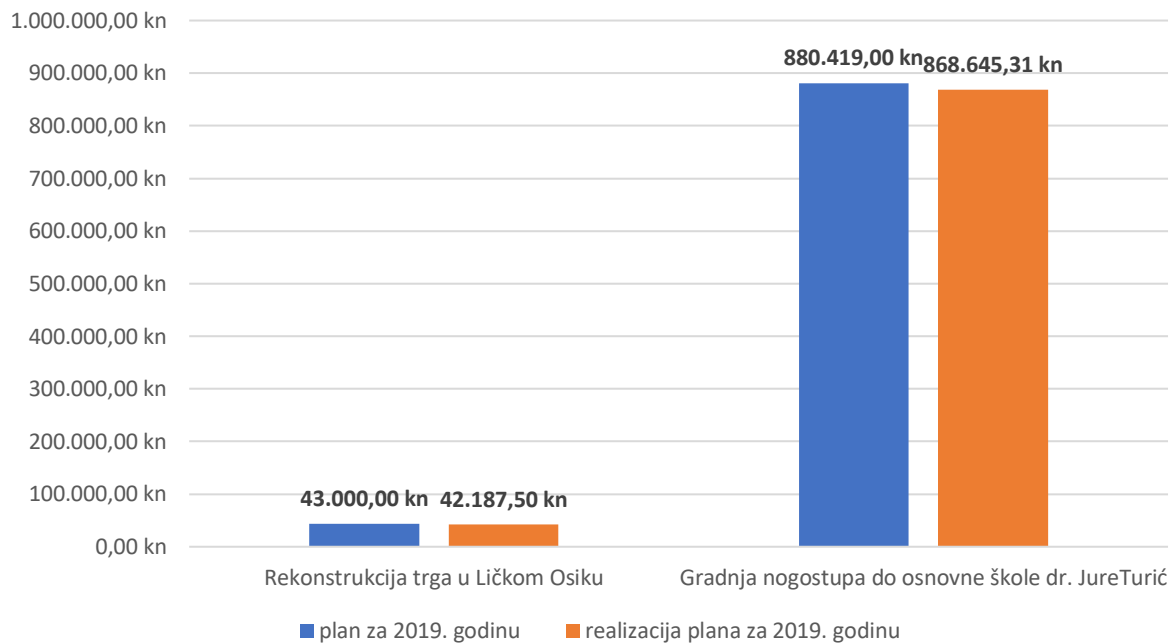


Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

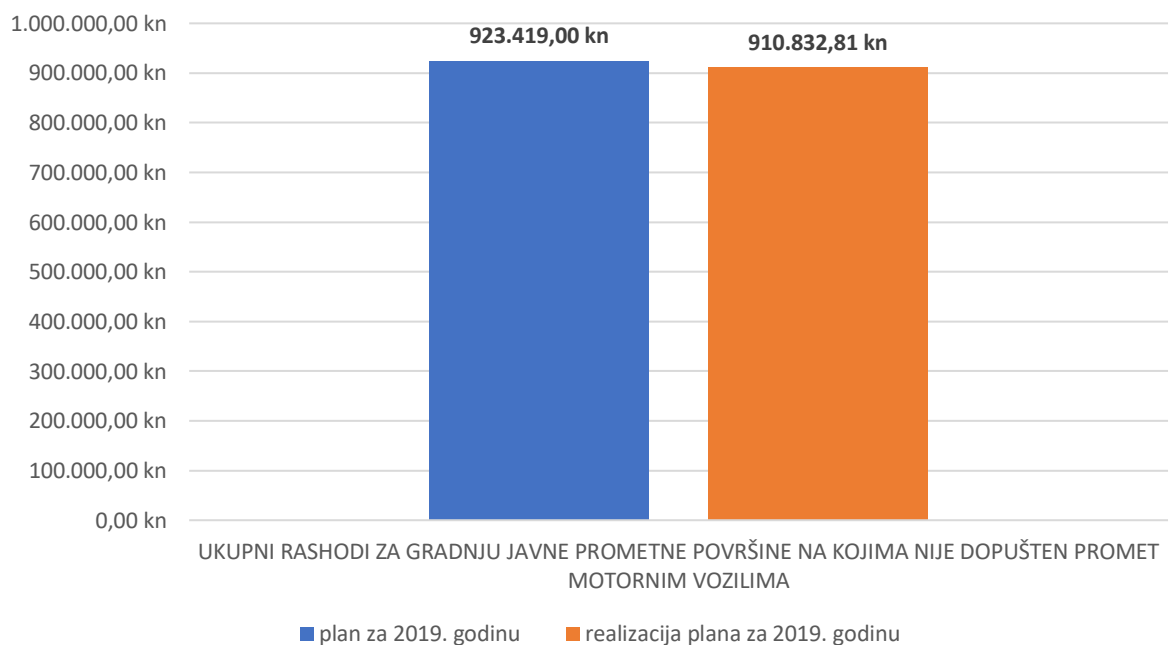

Izvor sredstava za ostvarivanje programa gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

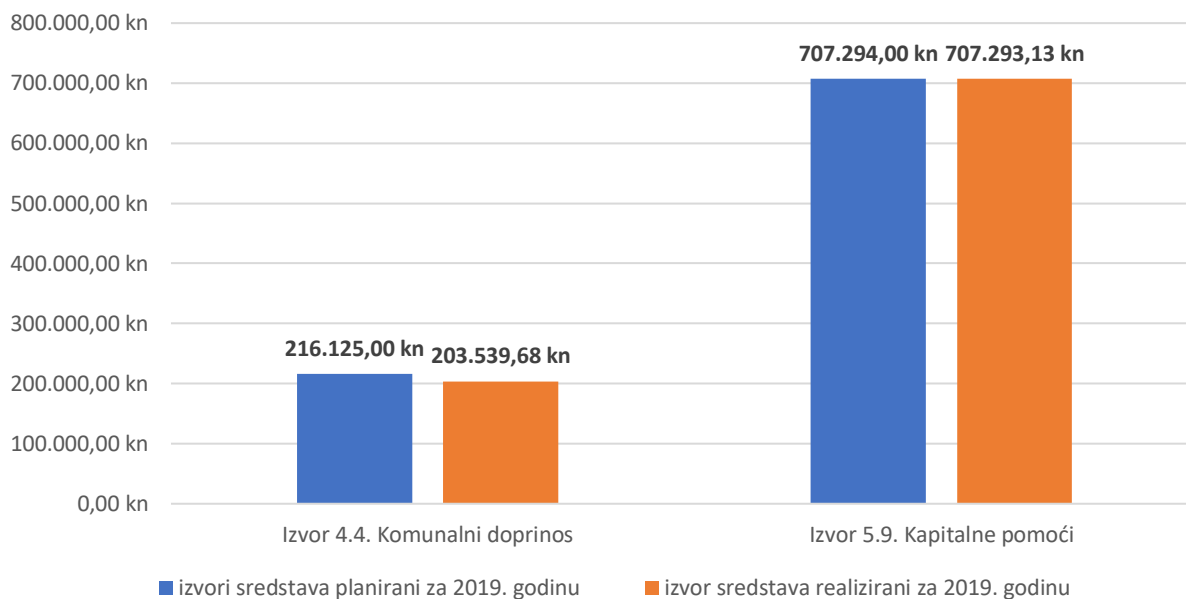


Izvor sredstava za ostvarivanje programa gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

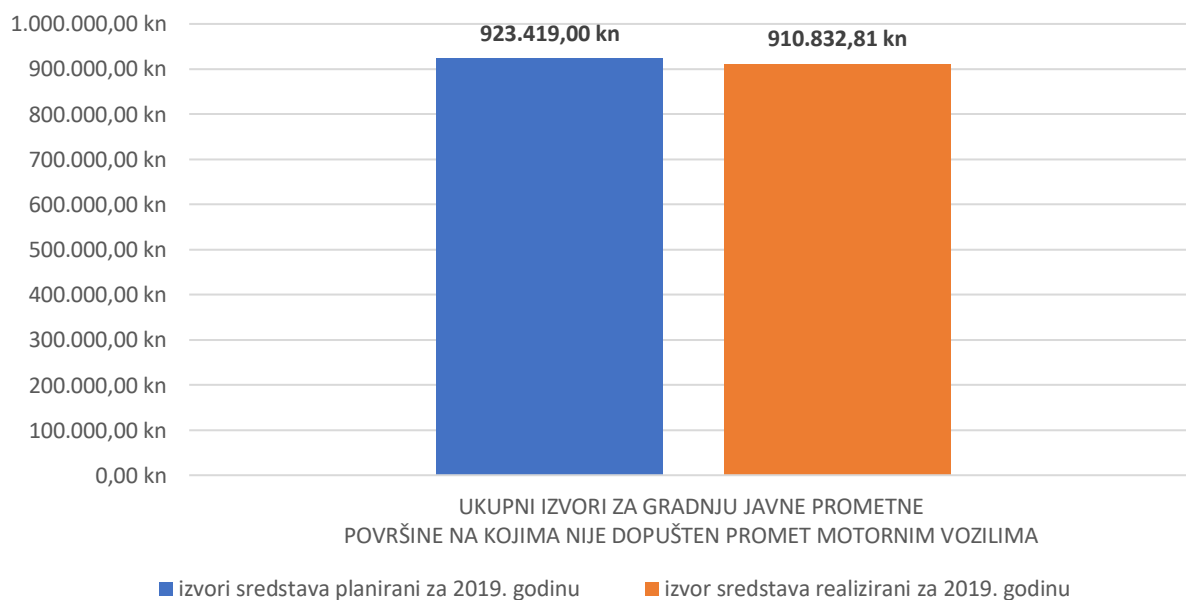


3. JAVNE ZELENE POVRŠINE


R. br.	Gradnja javnih zelenih površina	A	B	Indeks (B/A)*100
		Plan za 2019. godinu	Realizacija plana za 2019. godinu	
3.1.	Izgradnja dječjeg igrališta Gospić - Pazariška ulica (POS-ove zgrade) Gospić – Čardak (druga faza) Lički Osik (druga faza) Gospić - Trg Stjepana Radića	308.250,00 kn	306.621,69 kn	99,47
3.2.	Revitalizacija (oživljavanje, vraćanje prvotne živosti, obnavljanje) šume (parka) Jasikovac	1.538.851,00 kn	1.395.332,84 kn	90,67
UKUPNI RASHODI ZA GRADNJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA		1.847.101,00 kn	1.701.954,53 kn	92,14
Izvor sredstava za ostvarivanje programa gradnja javnih zelenih površina		Izvori sredstava planirani za 2019. godinu	Izvori sredstava realizirani u 2019. godini	Indeks (B/A)*100
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		266.567,00 kn	298.703,96 kn	112,06
Izvor 4.4. Komunalni doprinos		143.088,00 kn	145.913,85 kn	101,97
Izvor 4.5. Komunalna naknada		98.250,00 kn	95.903,24 kn	97,61
Izvor 5.6. Prijenos sredstava EU		959.002,00 kn	875.164,09 kn	91,26
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći		380.194,00 kn	286.269,39 kn	75,30
UKUPNI IZVORI ZA GRADNJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA		1.847.101,00 kn	1.701.954,53 kn	92,14

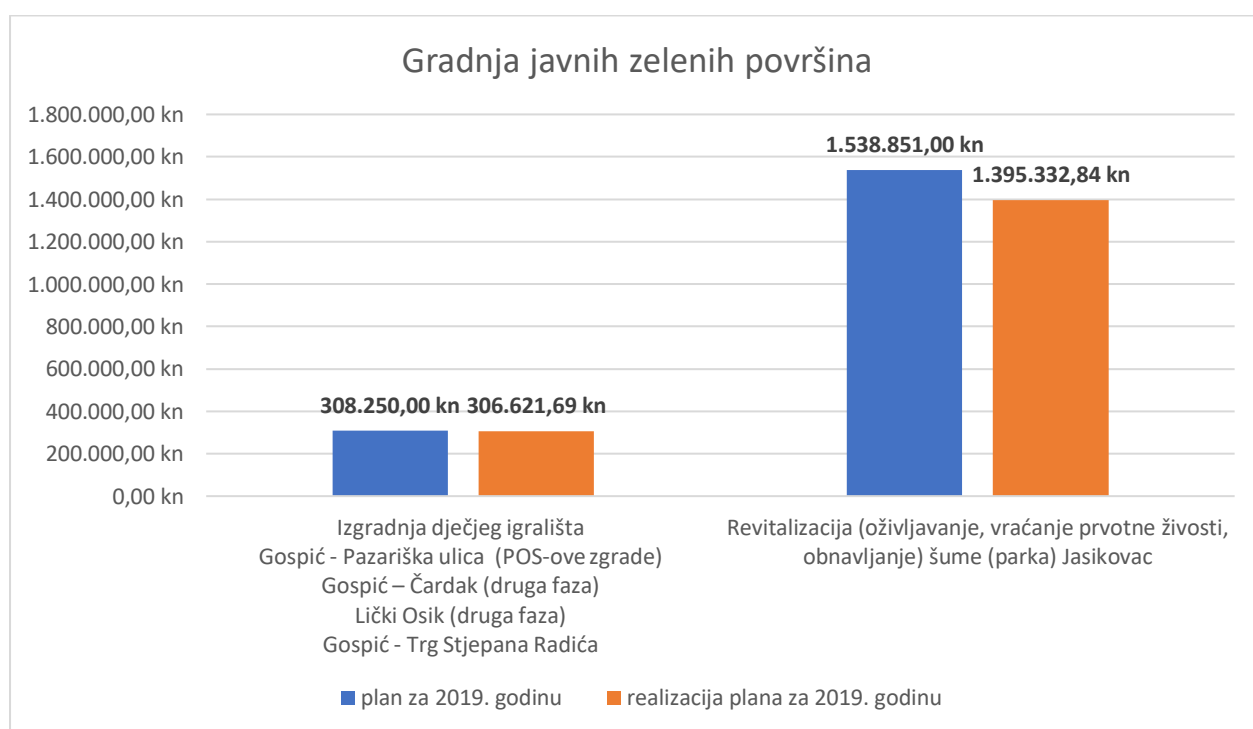


Gradnja javnih zelenih površina

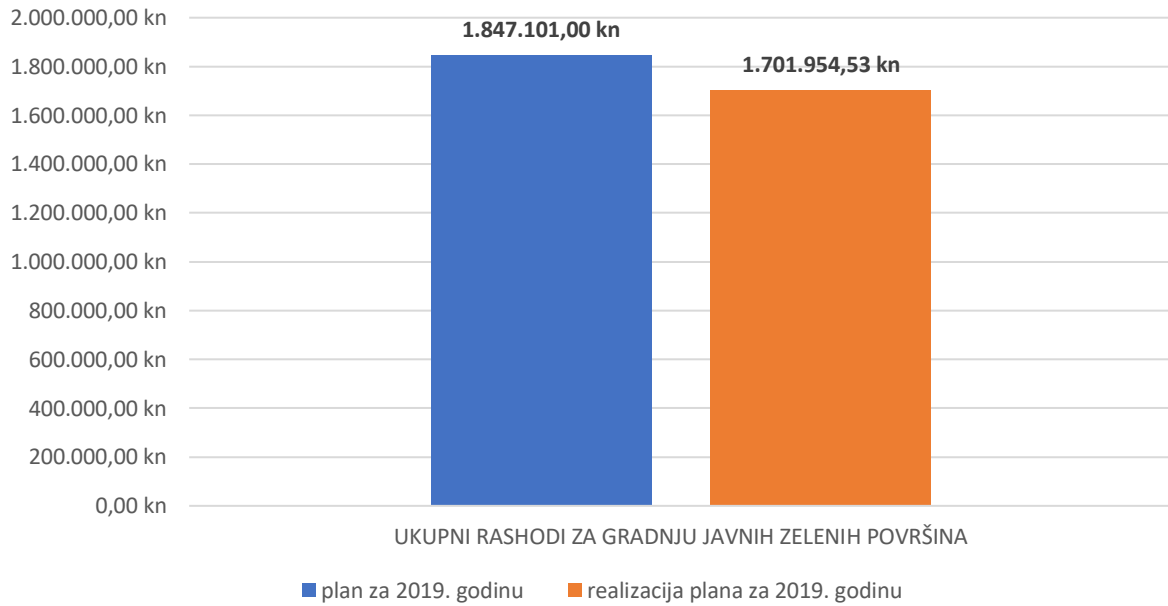

Izvor sredstava za ostvarivanje programa gradnja javnih zelenih površina

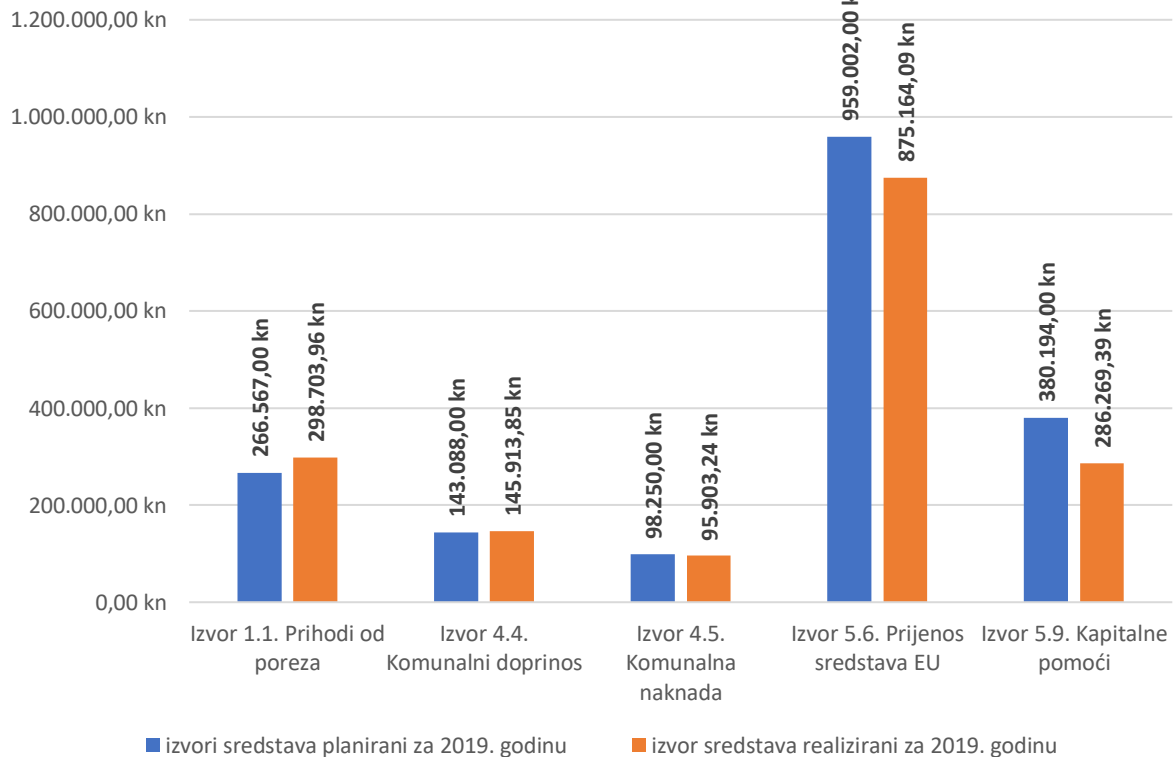


Izvor sredstava za ostvarivanje programa gradnja javnih zelenih površina

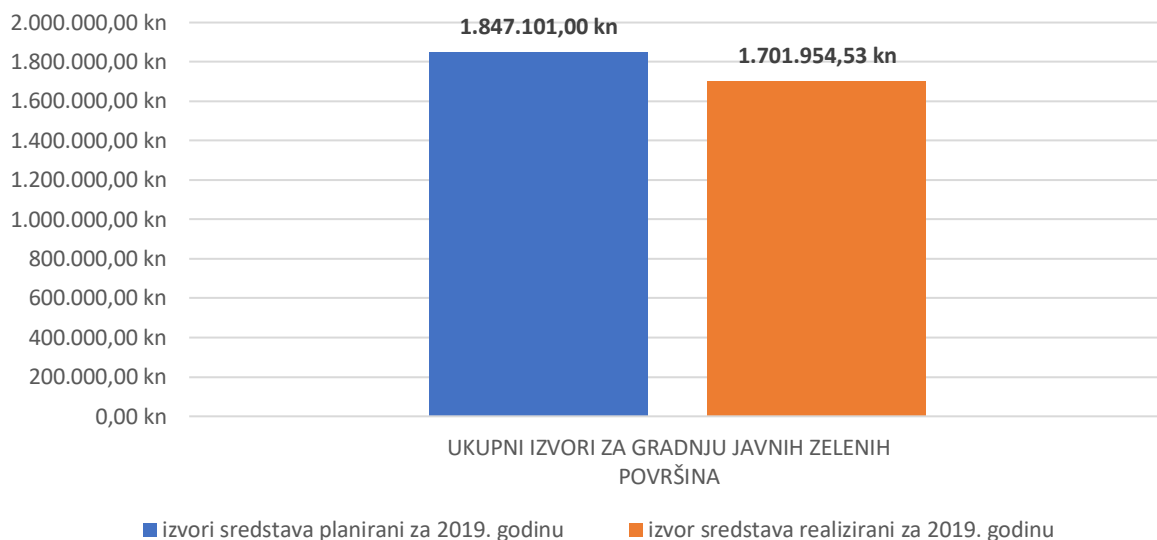


4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

R.br.	Gradnja građevina i uređaja javne namjene	A	B	Indeks (B/A)*100
		Plan za 2019. godinu	Realizacija plana za 2019. godinu	
4.1.	Nastavak izgradnje spomen obilježja žrtvama Domovinskog rata na Ljubovu	50.000,00 kn	94.250,00 kn	188,50
4.2.	Spajanje" dva spomenika u Ribniku	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00
4.3.	Spomenik žrtvama Drugog svjetskog i Domovinskog rata u Širokoj Kuli	25.000,00 kn	15.687,87 kn	0,00
UKUPNI RASHODI ZA GRADNJU GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE		100.000,00 kn	109.937,87 kn	109,94
Izvor sredstava za ostvarivanje programa gradnja građevina i uređaja javne namjene		Izvori sredstava planirani za 2019. godinu	Izvori sredstava realizirani u 2019. godini	Indeks (B/A)*100
Izvor 4.4. Komunalni doprinos		100.000,00 kn	94.250,00 kn	94,25
Izvor 4.5. Komunalna naknada		0,00 kn	15.687,87 kn	0,00
UKUPNI IZVORI ZA GRADNJU GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE		100.000,00 kn	109.937,87 kn	109,94


Gradnja građevina i uređaja javne namjene

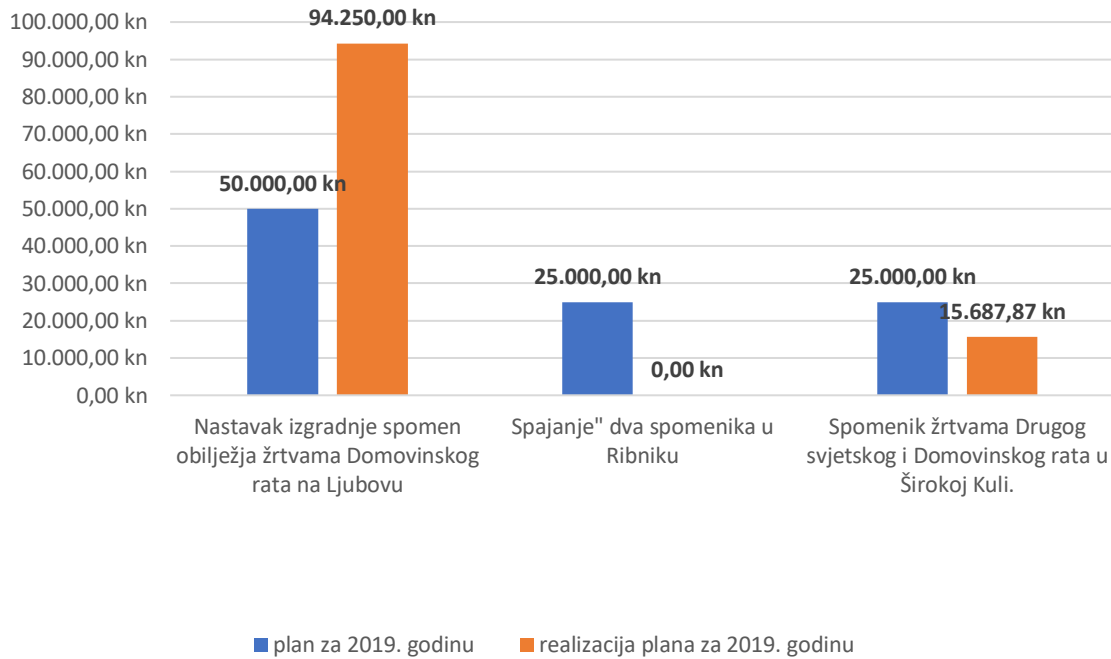


Gradnja građevina i uređaja javne namjene

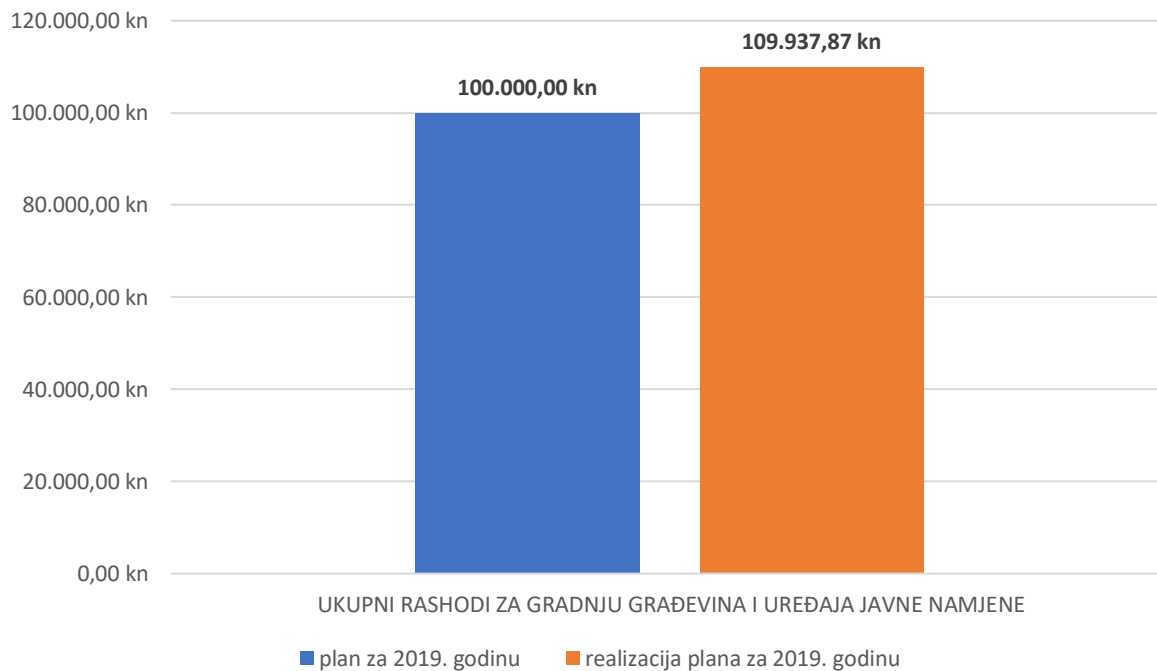

Izvor sredstava za ostvarivanje programa gradnja građevina i uređaja javne namjene

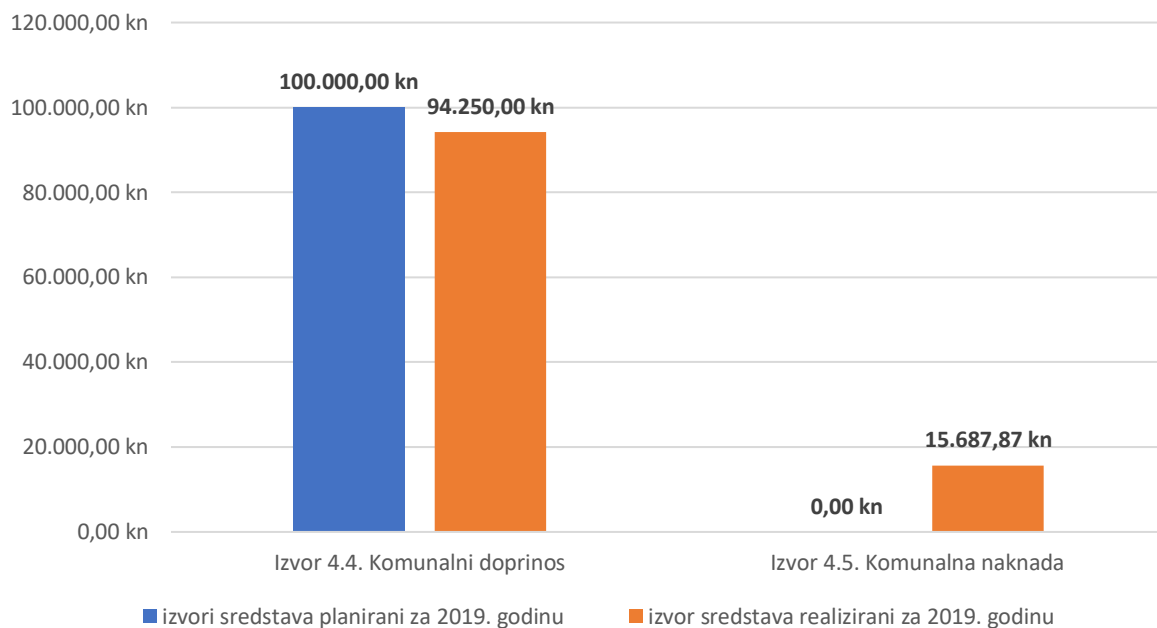



Izvor sredstava za ostvarivanje programa gradnja građevina i uređaja javne namjene

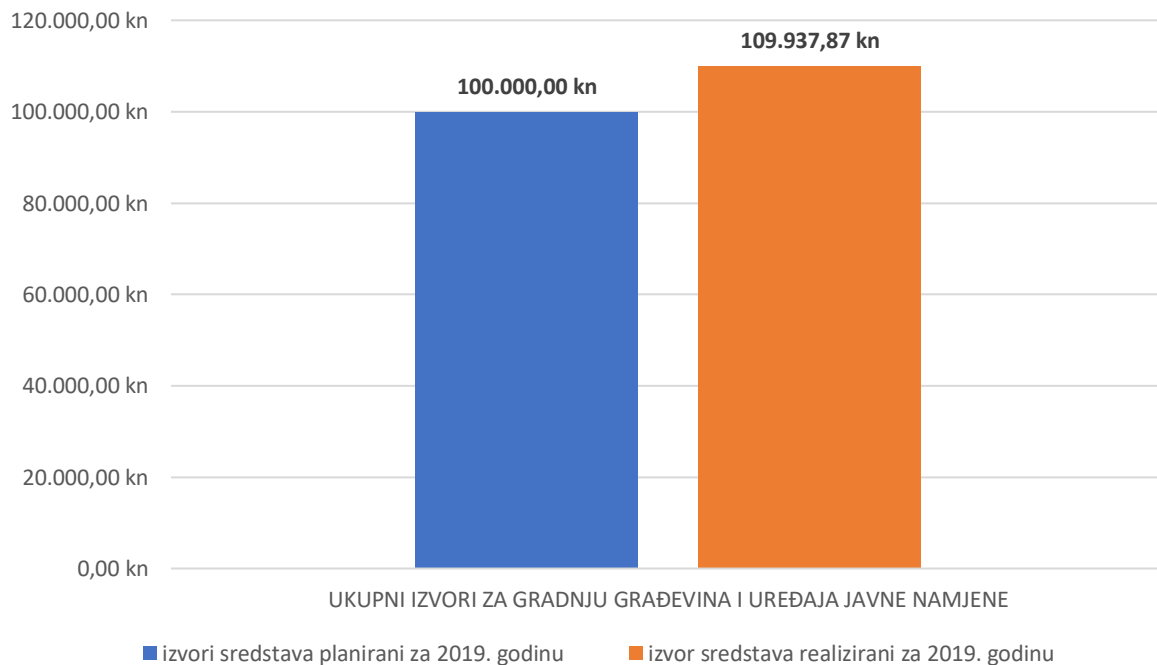

5. JAVNA RASVJETA


		A	B	
R. br.	Gradnja javne rasvjete	Plan za 2019. godinu	Realizacija plana za 2019. godinu	Indeks (B/A)*100
5.1.	Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete	90.000,00 kn	87.337,50 kn	97,04
5.2.	Izgradnja javne rasvjete po Mjesnim odborima	25.000,00 kn	23.287,50 kn	93,15
UKUPNI RASHODI ZA GRADNJU JAVNE RASVJETE		115.000,00 kn	110.625,00 kn	96,20
Izvor sredstava za ostvarivanje programa gradnja javne rasvjete		Izvori sredstava planirani za 2019. godinu	Izvori sredstava realizirani u 2019. godini	Indeks (B/A)*100
Izvor 4.4. Komunalni doprinos		115.000,00 kn	110.625,00 kn	96,20
UKUPNI IZVORI ZA GRADNJU JAVNE RASVJETE		115.000,00 kn	110.625,00 kn	96,20


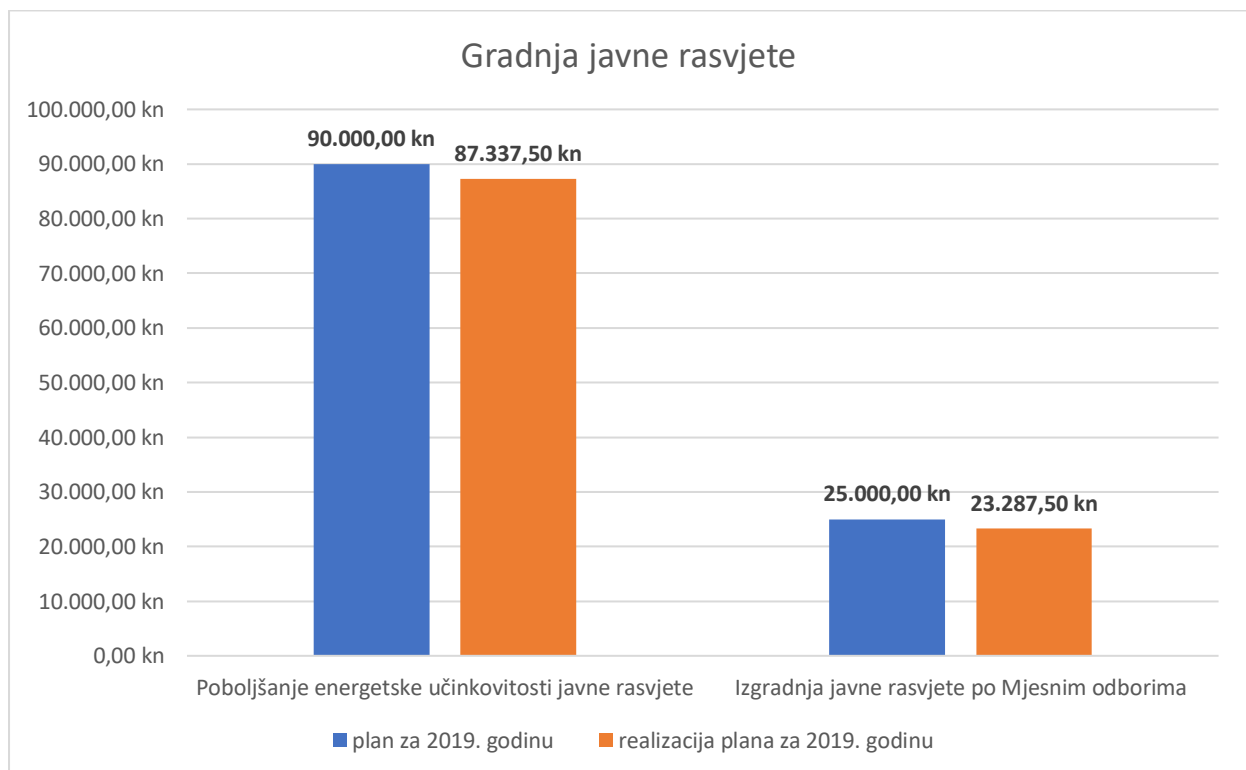


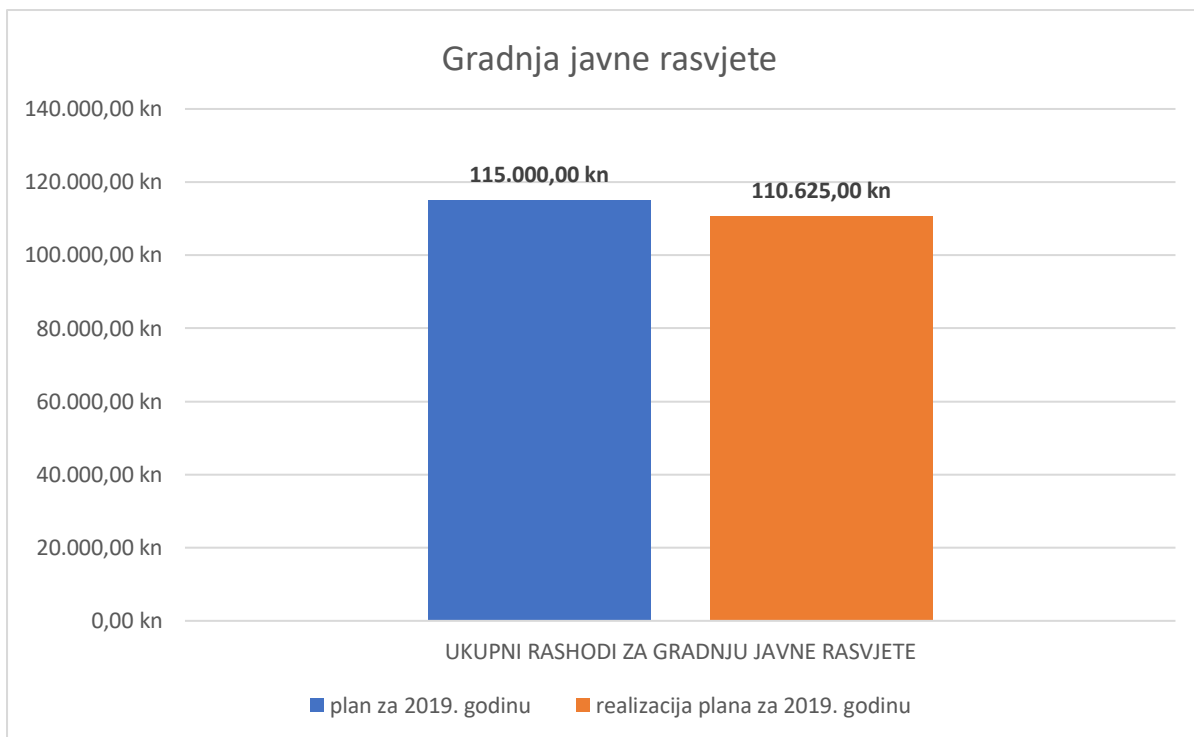


6. GROBLJA

R. br.	Gradnja groblja	A Plan za 2019. godinu	B Realizacija plana za 2019. godinu	Indeks (B/A)*100
6.1.	Izgradnja grobnica za branitelje	20.000,00 kn	6.000,00 kn	30,00
6.2.	Asfaltiranje parkirališta na grobljima	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00
6.3.	Asfaltiranje ili popločavanje pješačkih staza na grobljima	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00
6.4.	Asfaltiranje prostora za ispraćaj pokojnika	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00
6.5.	Izgradnja ograde oko groblja	26.504,00 kn	44.835,00 kn	169,16
UKUPNI RASHODI ZA GRADNJU GROBLJA		106.504,00 kn	50.835,00 kn	47,73
Izvor sredstava za ostvarivanje programa gradnja groblja		Izvori sredstava planirani za 2019. godinu	Izvor sredstava realizirani za 2019. godinu	Indeks (B/A)*100
Izvor 4.4. Komunalni doprinos		96.504,00 kn	0,00 kn	0,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		10.000,00 kn	6.000,00 kn	60,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine		0,00 kn	44.835,00 kn	
UKUPNI IZVORI ZA GRADNJU GROBLJA		106.504,00 kn	50.835,00 kn	47,73

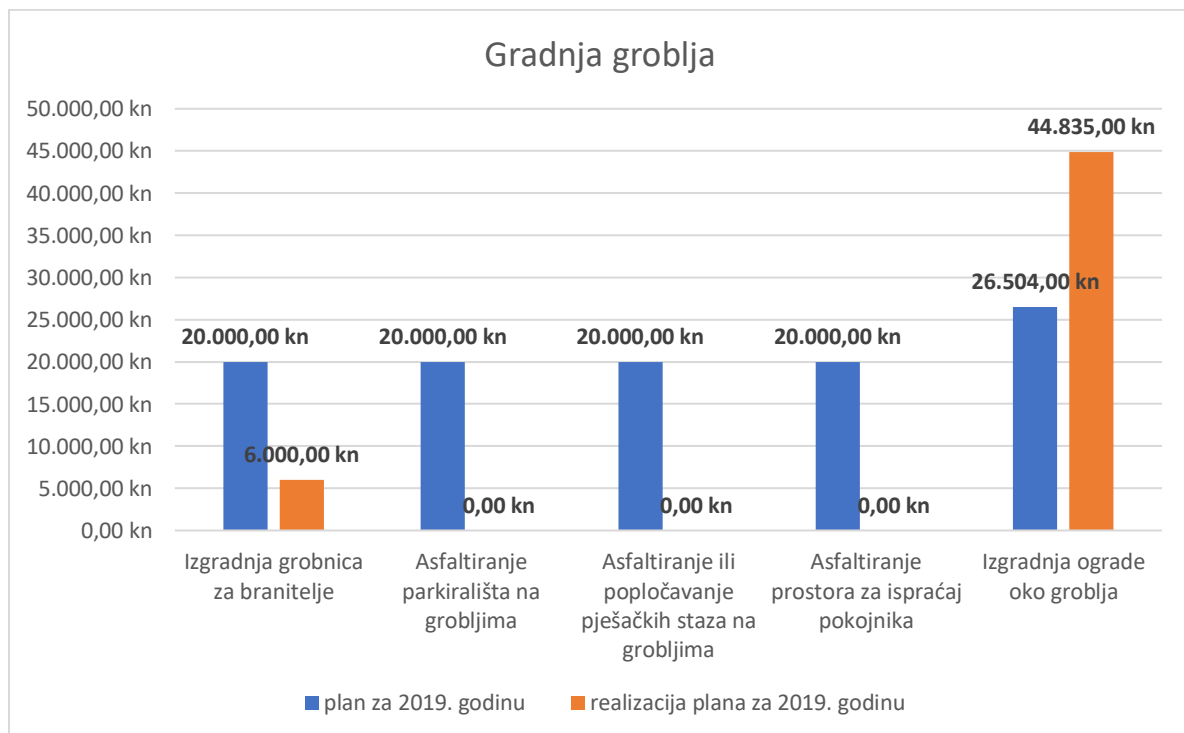

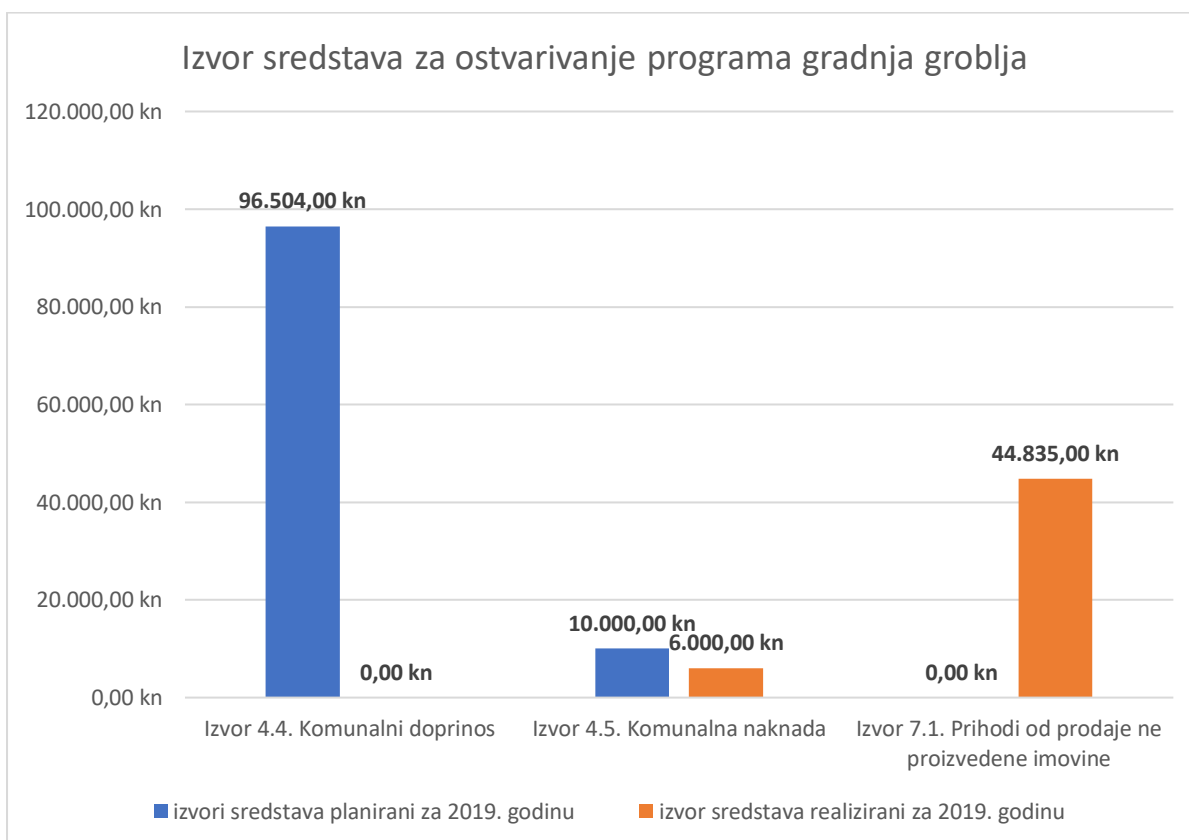
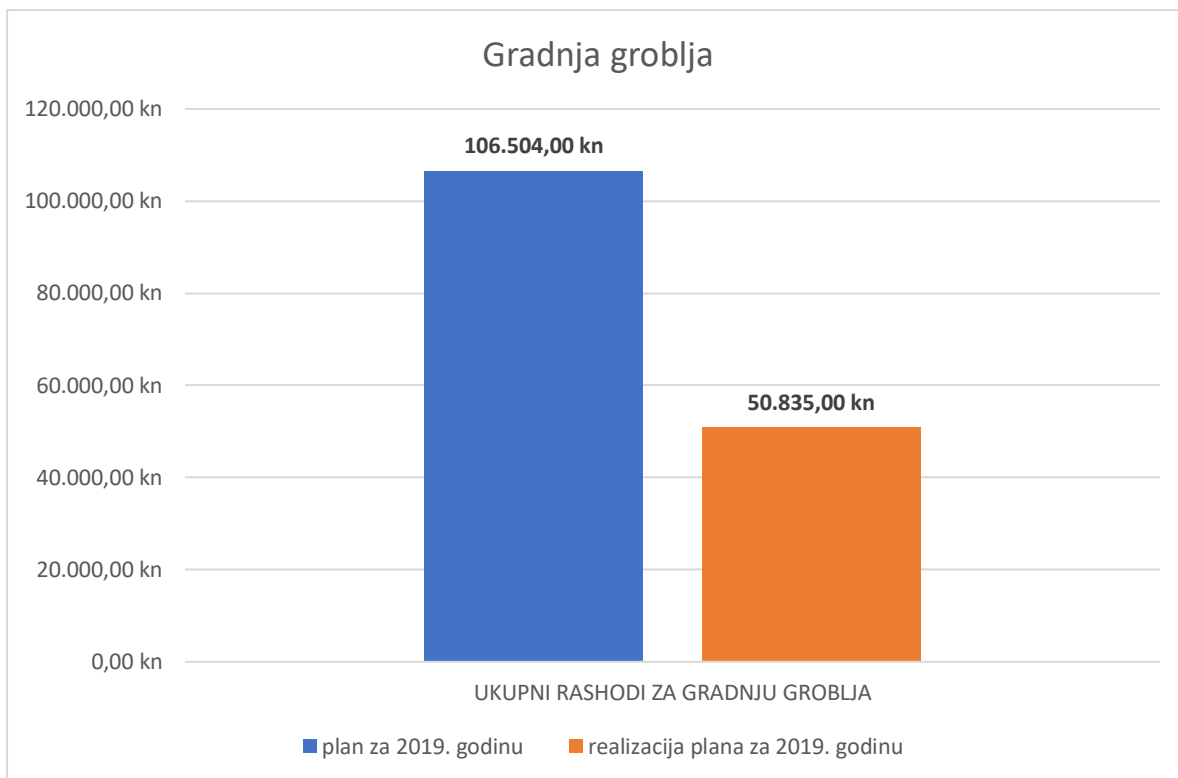


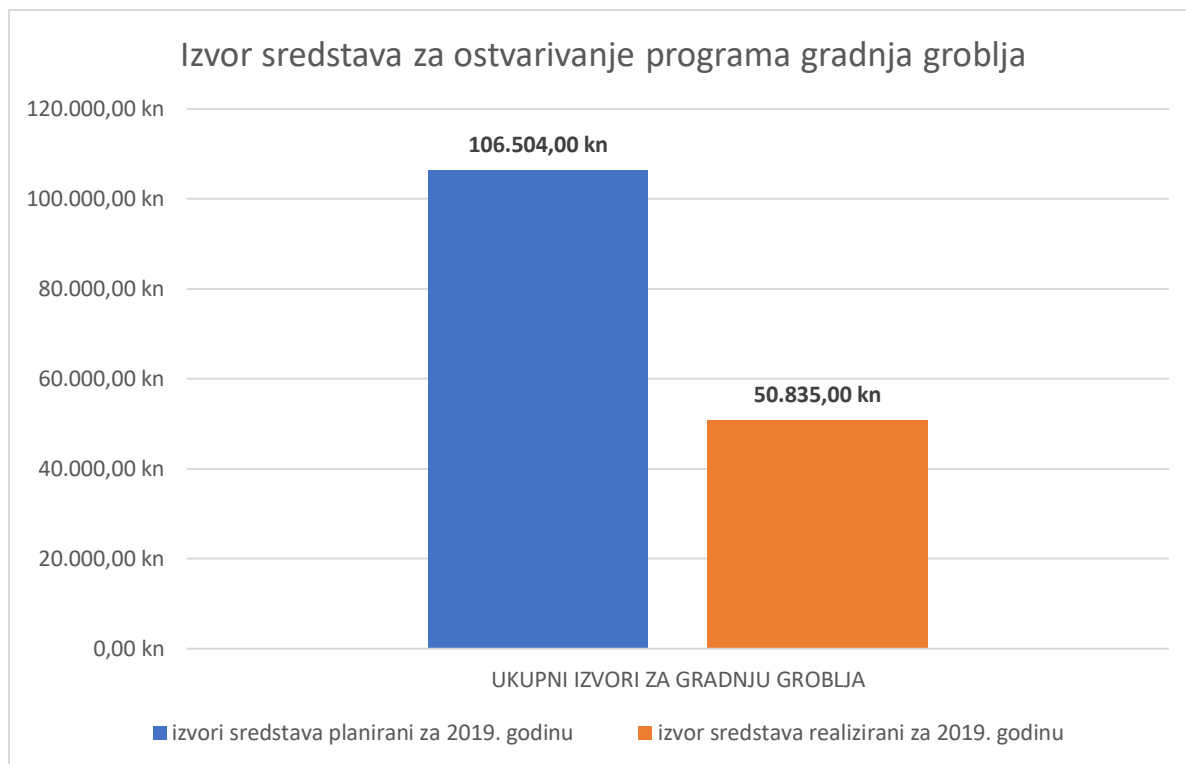


7. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIOM OTPADOM

R. br.	Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	A Plan za 2019. godinu	B Realizacija plana za 2019. godinu	Indeks (B/A)*100
7.1.	Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Rakitovac	15.000,00 kn	11.500,00 kn	76,67
7.2.	Izgradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad	80.000,00 kn	18.750,00 kn	23,44
7.3.	Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad	40.000,00 kn	37.500,00 kn	93,75
7.4.	Za grad sa smiješkom	384.039,00 kn	389.737,50 kn	101,48
7.5.	Oprema za odvojeno prikupljanje otpada za domaćinstvo (nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada)	150.000,00 kn	150.000,00 kn	100,00
UKUPNI RASHODI ZA GRADNJU GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIOM OTPADOM		669.039,00 kn	607.487,50 kn	90,80
Izvor sredstava za ostvarivanje programa gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom		Izvori sredstava planirani za 2019. godinu	Izvori sredstava realizirani u 2019. godini	Indeks (B/A)*100
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		64.105,00 kn	58.498,40 kn	91,25
Izvor 1.2. Ostali opći prihodi		50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada		235.000,00 kn	167.750,00 kn	71,38
Izvor 5.6. Prijenos sredstava EU		319.934,00 kn	331.239,10 kn	103,53


UKUPNI IZVORI ZA GRADNJU GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIOM OTPADOM	669.039,00 kn	607.487,50 kn	90,80
---	----------------------	----------------------	--------------

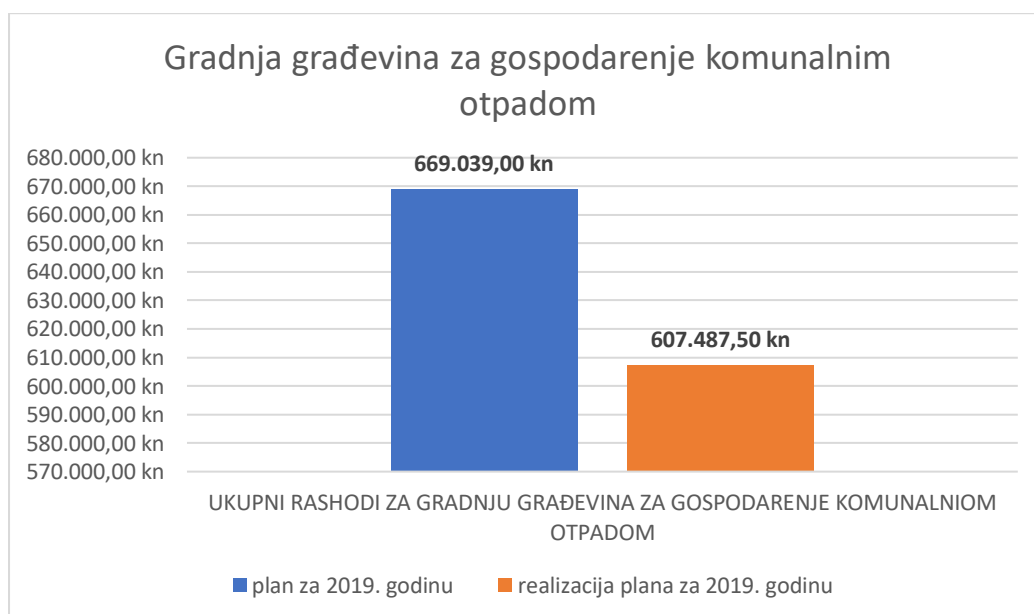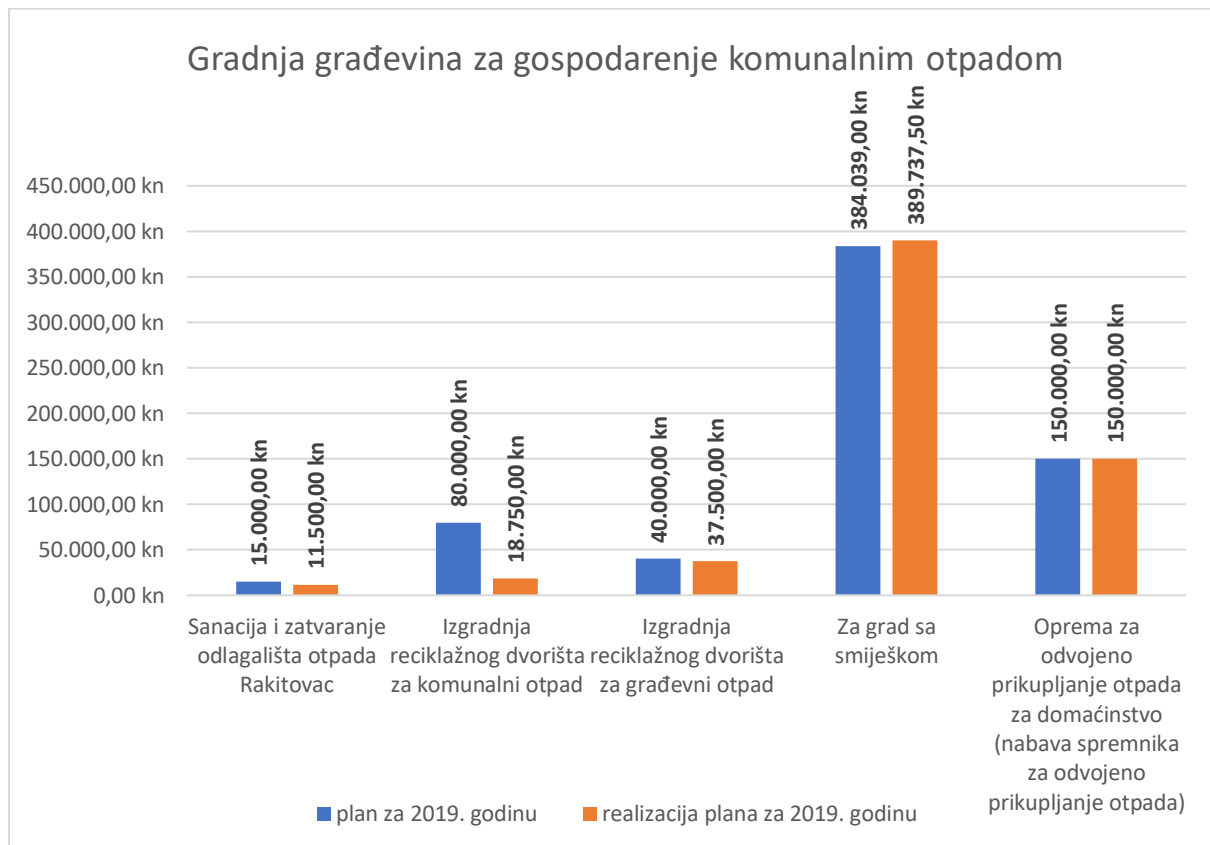

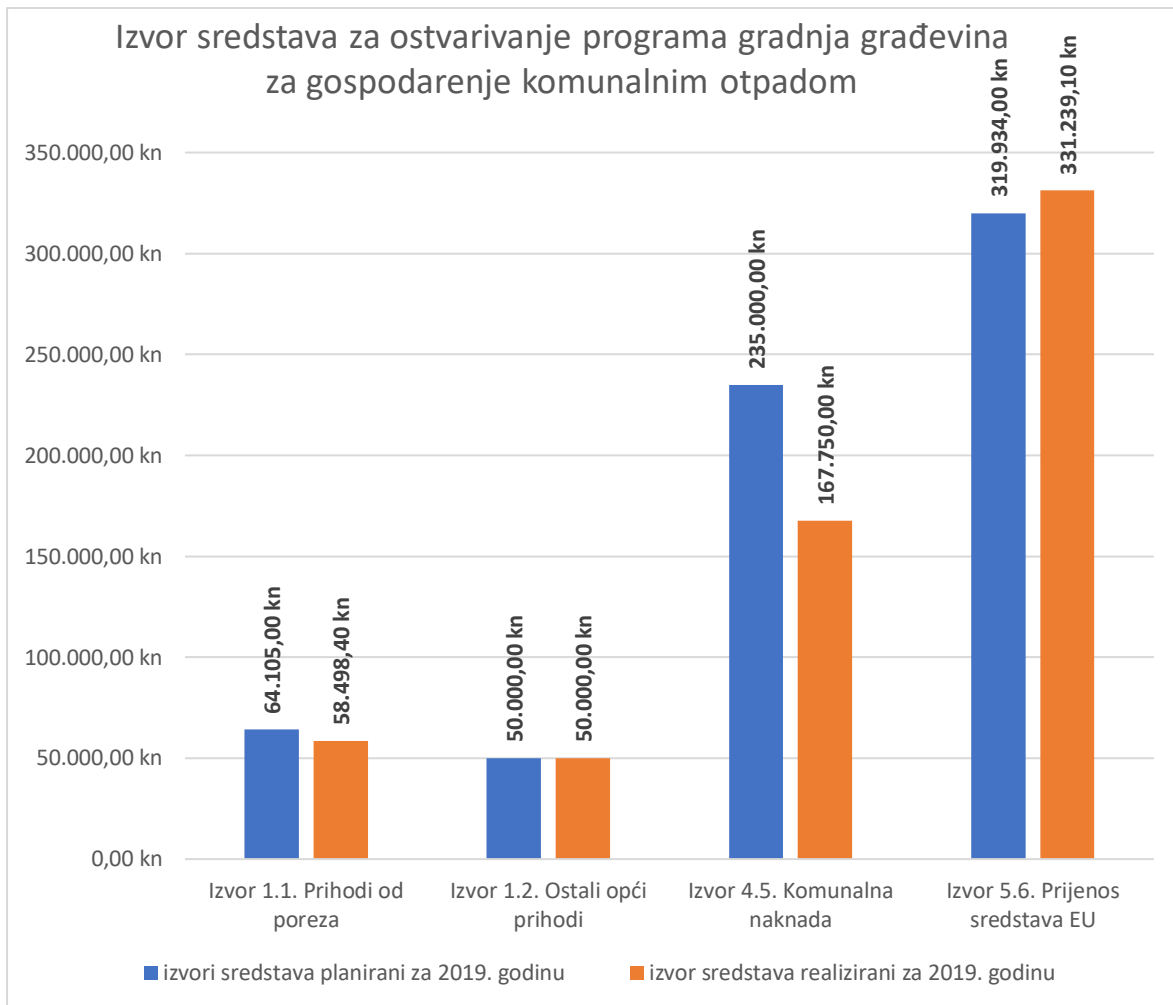


8. PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI


R. br.	Program energetske učinkovitosti	A Plan za 2019. godinu	B Realizacija plana za 2019. godinu	Indeks (B/A)*100
8.1.	Elektropunionica (električna energija)	3.000,00 kn	2.669,58 kn	88,99
8.2.	Izrada stručne dokumentacije, obrazovanje (edukacija) građana i ostale aktivnosti na temu energetske učinkovitosti	12.000,00 kn	11.656,25 kn	97,14
8.3.	Energetska obnova zgrade Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana na Ličkom Osiku.	3.529.744,00 kn	2.648.360,24 kn	75,03
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		3.544.744,00 kn	2.662.686,07 kn	75,12
Izvor sredstava za ostvarivanje programa energetske učinkovitosti		Izvori sredstava planirani za 2019. godinu	Izvori sredstava realizirani u 2019. godini	Indeks (B/A)*100
Izvor 4.5. Komunalna naknada		15.000,00 kn	14.325,83 kn	95,51
Izvor 5.6. Prijenos sredstava EU		1.697.099,00 kn	1.199.824,52 kn	70,70
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		1.832.645,00 kn	1.448.535,72 kn	79,04
UKUPNI IZVORI ZA PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		3.544.744,00 kn	2.662.686,07 kn	75,12

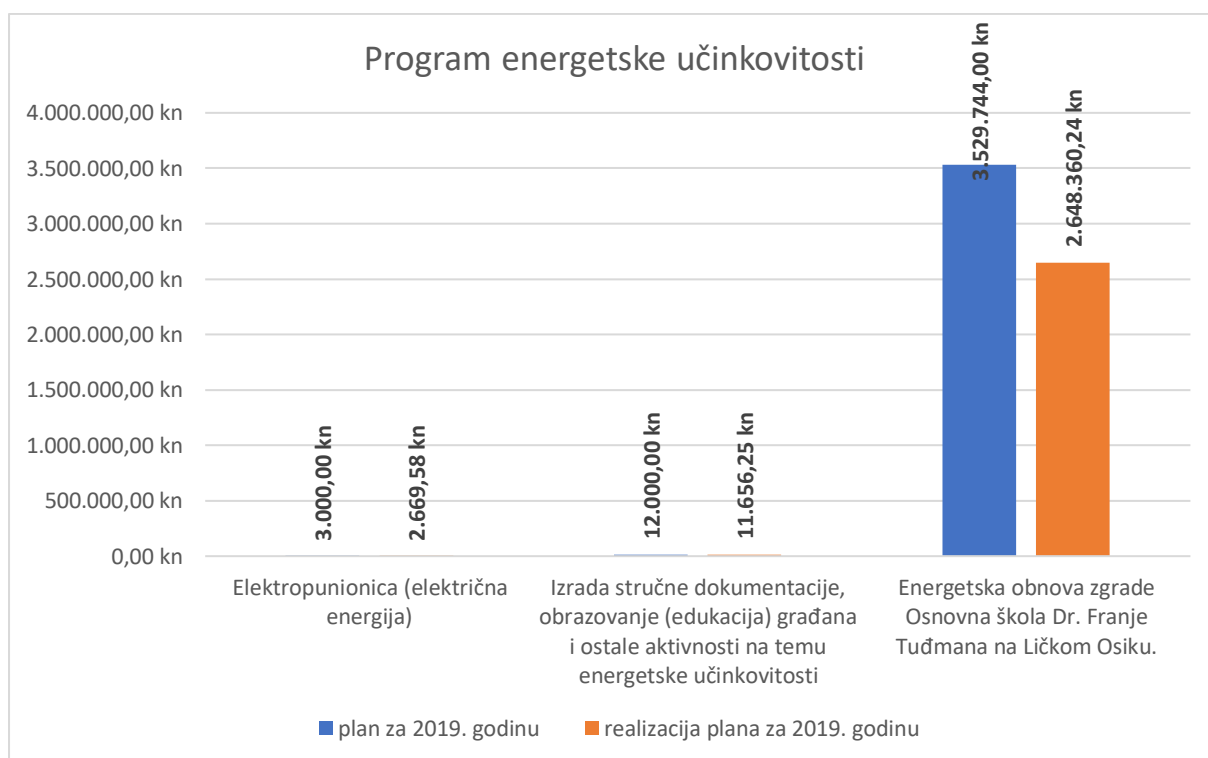


Program energetske učinkovitosti

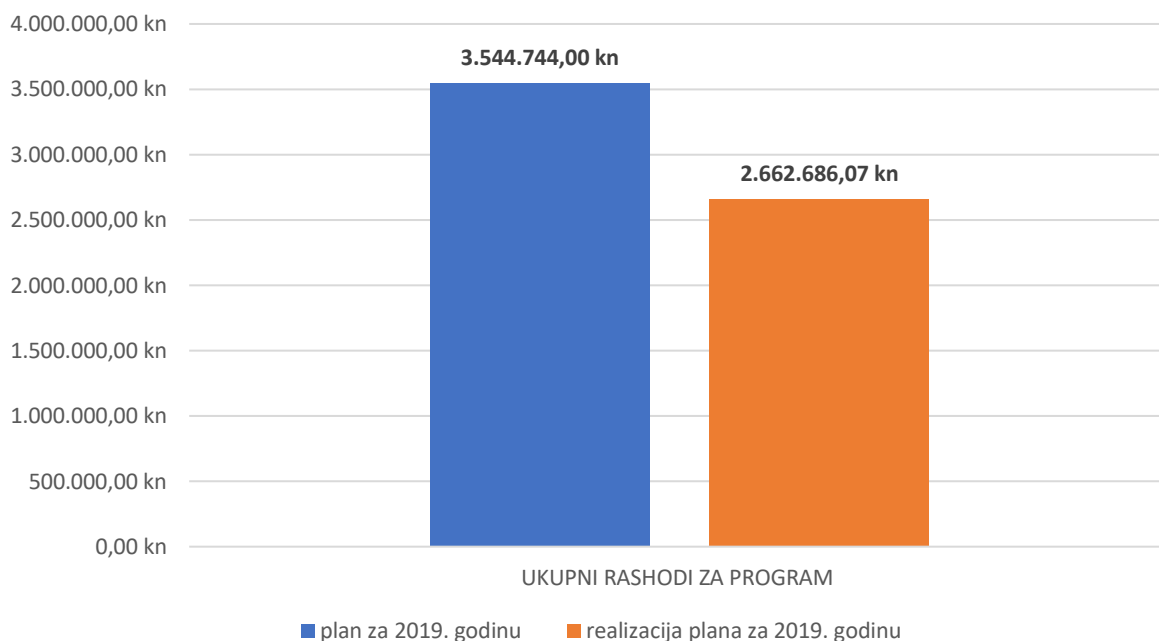


Izvor sredstava za ostvarivanje programa energetske učinkovitosti

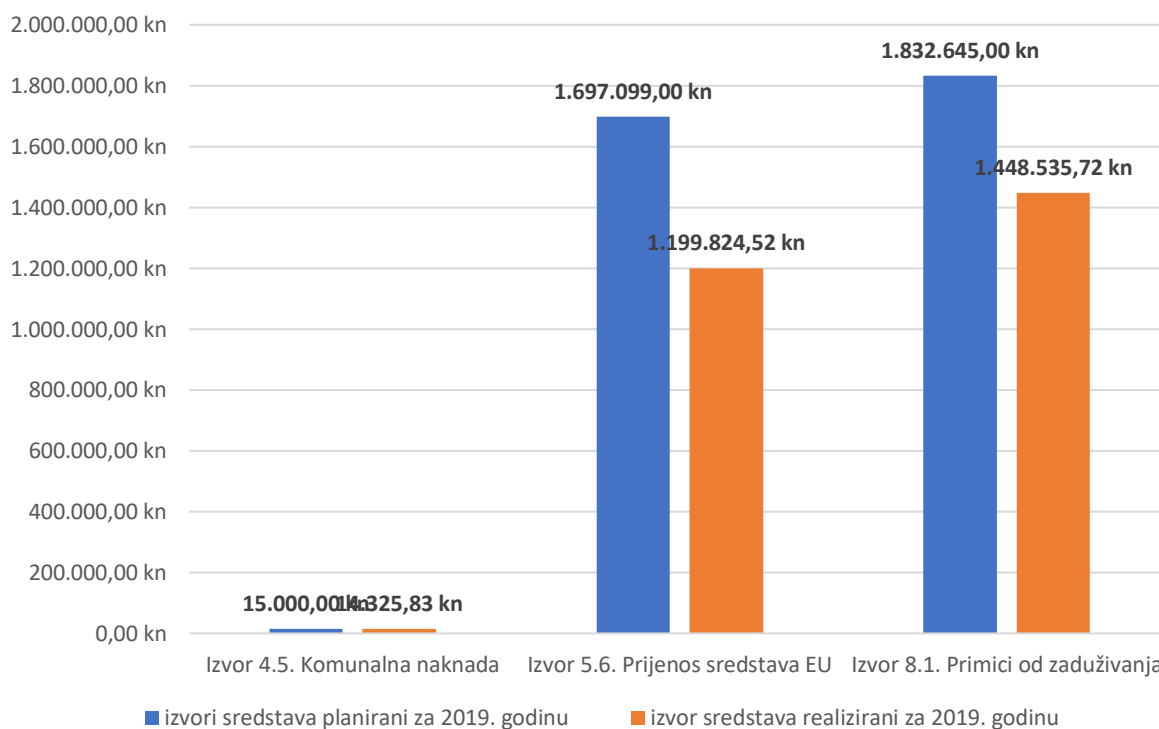

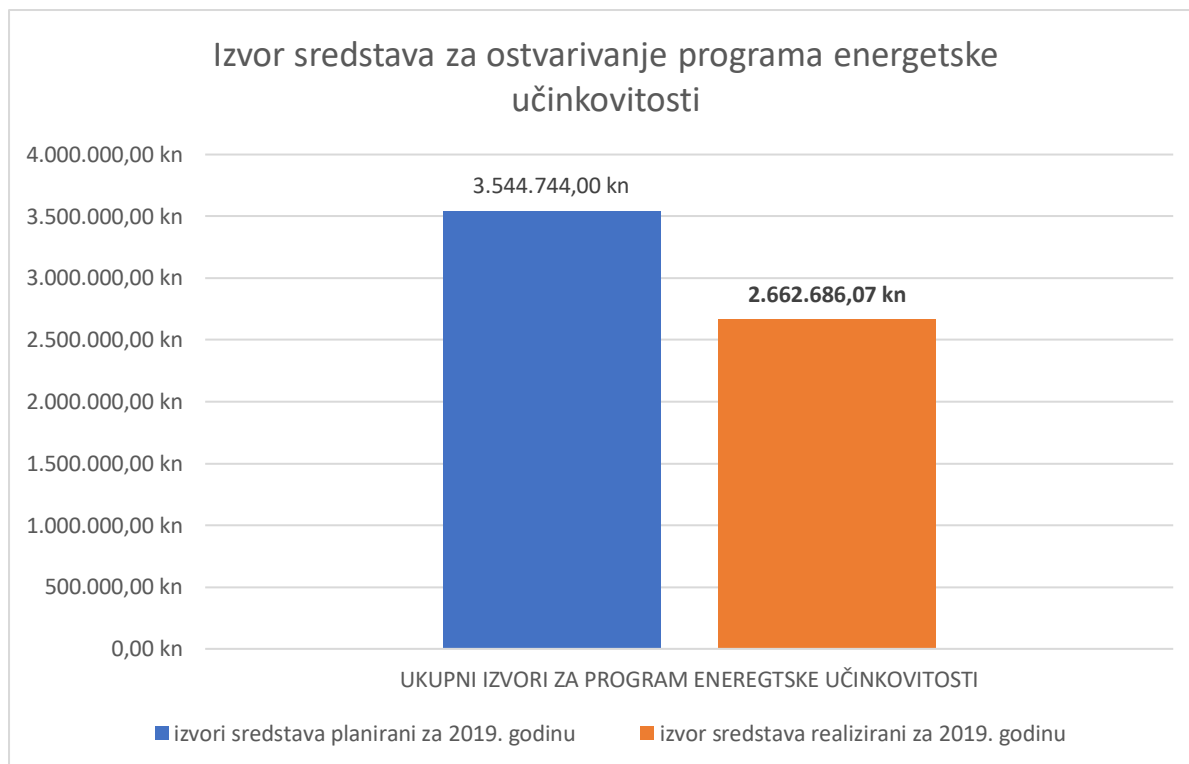

9. SVEUKUPNA REALIZACIJA PROGRAMA

R. br.		Plan za 2019. godinu (A)	Realizacija plana za 2019. godinu (B)	Indeks (B/A)*100
1.	Gradnja nerazvrstanih cesta	3.104.075,00 kn	2.867.966,25 kn	92,39
2.	Gradnja javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	923.419,00 kn	910.832,81 kn	98,64
3.	Gradnja javnih zelenih površina	1.847.101,00 kn	1.701.954,53 kn	92,14
4.	Gradnja građevina i uređaja javne namjene	100.000,00 kn	109.937,87 kn	109,94
5.	Gradnja javne rasvjete	115.000,00 kn	110.625,00 kn	96,20
6.	Gradnja groblja	106.504,00 kn	50.835,00 kn	47,73
7.	Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	669.039,00 kn	607.487,50 kn	90,80
8.	Program energetske učinkovitosti	3.544.744,00 kn	2.662.686,07 kn	75,12
	Ukupno	10.409.882,00 kn	9.022.325,03 kn	86,67

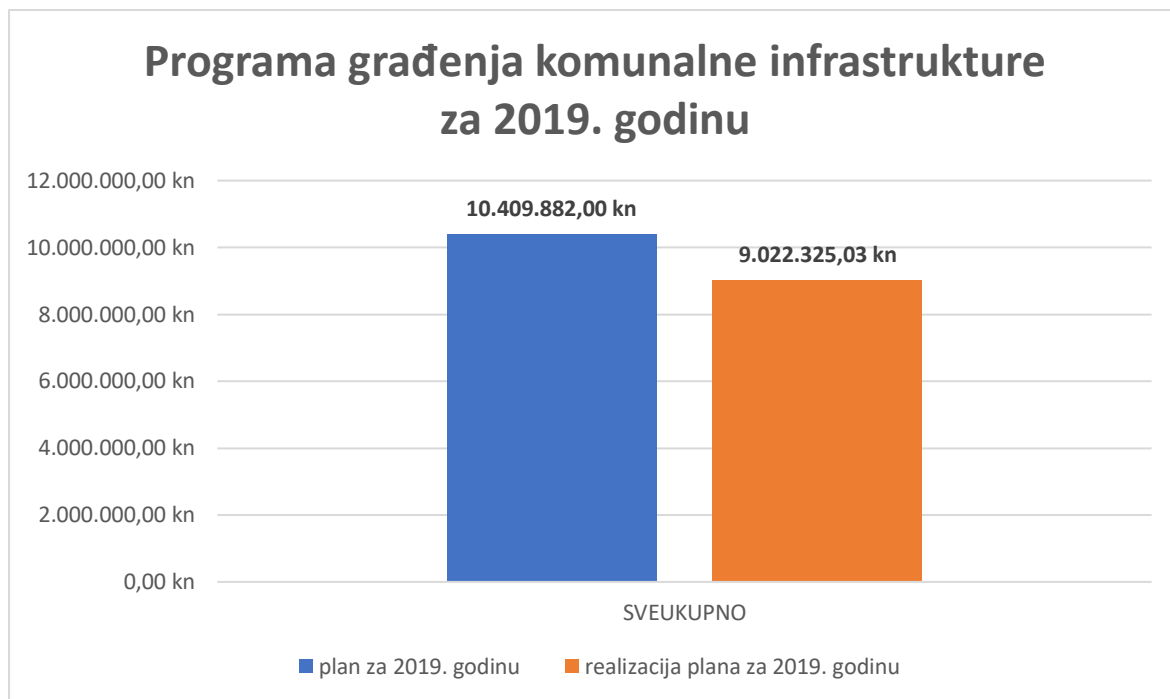

10. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

NERAZVRSTANE CESTE

Grad Gospić je na Natječaj za provedbu podmjere 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije" – provedba tipa operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta" iz Programa ruralnog razvoja prijavio projekt „Prilazna cesta do odlagališta Rakitovac u Gospiću“. Glavni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete života na ruralnom području kroz unaprjeđenje komunalne infrastrukture rekonstrukcijom prilazne ceste do odlagališta Rakitovac. S izvođačem radova Strabag d.o.o. potpisan je Ugovor o izvođenju radova u vrijednosti 1.226.346,55 kn koji se u 100% iznosu financira iz Programa ruralnog razvoja. Radovi na rekonstrukciji ceste prema odlagalištu otpada Rakitovac završeni su u mjesecu lipnju 2019. godine. U tijeku je ishođenje uporabne dozvole.

Rekonstrukcija šumskih prometnica u šumskom kompleksu „Zapadni dio uz jezero Kruščica“ projekt je koji je Grad Gospić prijavio na natječaj iz podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 4.071.008,65 kn, uz 100% financiranje Europske unije iz Programa ruralnog razvoja.

Ovim će se projektom rekonstruirati postojeća šumska cesta, koja u sadašnjem obliku i sadašnjem stanju ne zadovoljava propisane tehničke uvjete za šumske ceste. Također će se povećati razina protupožarne zaštite, racionalizirati troškovi šumarskih radova (uzgajanja, zaštite, uređivanja i dr.), omogućiti lakši pristup lovištu, a predmetna prometnica bi imala i naglašenu turističku, rekreativnu te ostale općekorisne funkcije. Radovi na izgradnji ceste na

relaciji Vaganac-Kruščica su počeli u mjesecu srpnju 2019. godine, a u izvještajnom razdoblju odrađeno je 10% radova (proširena je trasa u dužini 700 m, završeni su zemljani radovi i nasipi, izrađen je gornji stroj ceste i riješena je odvodnja. Rok završetka radova je listopad 2020. godine.

Radovi na rekonstrukciji dijela ceste Barlete su završeni u mjesecu listopadu 2018. godine. Primopredaja je izvršena 30.5.2019. godine. Obzirom na stanje nerazvrstane ceste Barlete, opterećenosti teretnim prometom, te u cilju povećanja sigurnosti i postizanja veće kvalitete prometne infrastrukture na području Grada Gospića, nužno je bilo pristupiti izvođenju radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Barlete. Projekt rekonstrukcije ceste zajednički su realizirali Grad Gospić i tvrtka CALCIT LIKA d.o.o. Gospić. Sveukupna realizacija projekta koji se realizirao dijelom u 2018., a dijelom u 2019. godini je 3.646.816,48 kn.

Programom za evidenciju nerazvrstanih cesta pipGIS pišu se radni nalozi prema Komunalcu Gospić d.o.o. i prema Lika cestama d.o.o., omogućeno je i praćenje realizacija izdanih radnih naloga, prikupljaju se podaci o neusklađenostima na javnim površinama, cestama, javnoj rasvjeti i općenito u okolišu Grada Gospića. Program pipGIS omogućava detaljnu specifikaciju i opis obavljenih radova kao i izračun troškova.

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Rekonstrukcija trga u Ličkom Osiku se odrađuje kroz Program održavanja komunalne infrastrukture. Nakon više od 20 godina, uredio se Trg hrvatskih žrtava Široke Kule. Uređenjem navedene javne površine želi se potaknuti građane na boravak, kretanje i zadržavanje na otvorenom prostoru, a jedan od ciljeva samog uređenja je i povećanje standarda i kvalitete života svih stanovnika Ličkog Osika.

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2018. godinu. Predmet javnog poziva je poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, odnosno projekti kojima se izravno utječe na sigurnost cestovnog prometa. Grad Gospić je na navedeni poziv prijavio projekt Gradnja nogostupa do osnovne škole dr. Jure Turić. Potpisanim ugovorom Grad je preuzeo obvezu realizacije projekta do kraja 2019. godine. Radovi su započeli početkom 2019. godine, a završeni u mjesecu kolovozu 2019. godine.

Predmetni nogostup izgradio se:

- u Ulici Popa Frana Biničkog sa istočne strane u duljini od cca 50 m, te zapadne strane u duljini od cca 46 m,
- u Ulici Senjskih žrtava, na istočnoj/sjevernoj strani u duljini od cca 144 m; te zapadnoj strani u duljini od cca 79 m,
- u Ulici Miroslava Kraljevića – kod škole dr. Jure Turića, na jugozapadnoj strani u duljini od cca 107 m.

Realizacija projekta Izgradnja trga Nikola Tesla (KIC) će se odraditi u 2020. godini.

JAVNE ZELENE POVRŠINE

Između Grada Gospića i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o sufinanciranju Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića, faza 2. kojim je Gradu Gospiću dodijeljeno 200.000,00 kn kojim će se dovršiti radovi na obnovi dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Pahuljica Gospić što će rezultirati sasvim novim izgledom, poboljšanom sigurnosti i specijaliziranim didaktičkim igralima na gumiranim sigurnosnim podlogama koja će pozitivno utjecati na motorički razvoj djece. Ukupna vrijednost projekta je 455.971,00 kn. Navedeni projekt predstavlja nastavak projekta kojim je u 2018. godini uređeno igralište u Dječjeg vrtića Pahuljica na Ličkom Osiku i dio igrališta u Gospiću. U 2019. godini

oprema, odnosno igrala su ugrađena, a ugradnja lijevane podloge, koja ovisi o vremenskim uvjetima izvršena je u 2020. godini.

Radovi na revitalizaciji (oživljavanje, vraćanje prvotne živosti, obnavljanje) šume (parka) Jasikovac su u izvještajnom razdoblju realizirani 80%. Ostatak radova je realiziran u 2020. godini. Cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini putem povećanja privlačnosti, očuvanja bioraznolikosti te uspostave boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine šuma Jasikovac. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.920.128,70 kn, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 2.020.554,79 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je sklopljen sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkim tijelom i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničkim tijelom razine 2.

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja. Za gradnju građevina i uređaja javne namjene utrošeno je 109.937,87 kn.

JAVNA RASVJETA

Sredstva utrošena za poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete odnose se na nabavu led rasvjete koja je ugrađena na području grada Gospića (Zagrebačka ulica, Kaniška ulica i druge lokacije).

Sredstva utrošena za izgradnju javne rasvjete po Mjesnim odborima odnosi se na osposobljavanje trafostanica u naseljima (Dunjevac, Smiljansko polje).

GROBLJA

Sredstva za realizaciju ovog pod programa utrošena su u izgradnju grobnica za branitelje u iznosu od 6.000,00 kn i za izgradnju ograde oko groblja u naselju Brušani u iznosu od 44.835,00 kn.

GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

U sklopu ovog pod programa realiziran je projekt Za grad sa smiješkom, koji se sufinancirao EU sredstvima. Projekt se proveo na cijelom području Grada Gospića, a sastoji se od 11 izobrazno edukativnih aktivnosti koje su usmjerene ka održivom gospodarenju otpadom. Završetak projekta realiziran je u 2020. godini.

U 2019. godini realizirana je i nabava spremnika za prikupljanje komunalnog otpada. Svrha nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada je nadopunjavanje postojeće količine spremnika firme Komunalac Gospić d.o.o..

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Radovi na energetskej obnovi zgrade Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana na Ličkom Osiku su počeli u lipnju 2019. godine. Cilj projekta je smanjiti negativne učinke na okoliš kroz provedbu 4 mjere energetske učinkovitosti na zgradi Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana na Ličkom Osiku u svrhu ostvarenja doprinosa smanjenju potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Mjere energetske učinkovitosti koje će se provesti su: (1) vanjska ovojnica, (2) strop prema negrijanom prostoru, stropovi prema tavanu, (3) zamjena kotla na biomasu i (4) zamjena rasvjetnih tijela. Provedbom navedenih mjera očekuje se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 791.605,92 kWh i smanjenje CO₂ za 190 t/god te se uvodi

korištenje OIE u predmetnoj zgradi. Projekt se sufinancira sredstvima EU fondova. U izvještajnom razdoblju realizirano je 80% radova i to mjera 1, 2 i 4.

Priključenje solarne elektrane (na elektro punionici) na distribucijsku mrežu s ciljem prodaje viška električne energije je aktivnost koja je započela u 2018., a završena u 2019. godini. Na krovu postojeće elektro punionice (Budačka 55) izgrađena je solarne elektrane kapaciteta 4,16 kW. U 2019. godini realiziran je postupak priključenja solarne elektrane na distribucijsku mrežu HEP-a.
