



REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENSKA ŽUPANIJA  
GRAD GOSPIĆ  
**GRADONAČELNIK**  
KLASA: 361-02/20-01/15  
URBROJ: 2125/01-02-22-08  
Gospić, 26. svibnja 2022. godine

## GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA

**Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu**  
- na razmatranje i donošenje – dostavlja se -

Poštovani,

na temelju članka 8. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 07/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13, 3/13-pročišćeni tekst, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), u privitku dopisa dostavljam Vam na razmatranje i donošenje prijedlog Zaključka o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Gradsko vijeće Grada Gospića je na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Sredstva planirana 29. prosinca 2021. godine iznosila su 9.124.276,00 kn.

Izmjene i dopune Programa su donesene temeljem članka 67. stavaka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 – Odluka USRH, 32/20) i članka 179. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21).

Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 – Odluka USRH, 32/20) Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Grada Gospića izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

U privitku ovog dopisa nalazi se i Izvješće s danim prikazom (rashodi, izvori financiranja, tablice, grafovi, obrazloženja) realizacije Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje predmetnog Zaključka.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA  
  
Karlo Starčević  
1



Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 – Odluka USRH, 32/20) i članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13, 3/13- pročišćeni tekst, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21 ), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu**

**I.**

Ovim Zaključkom prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

**II.**

Sastavni dio ovog Zaključka čini Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

**III.**

Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

Predsjednica  
Gradskog vijeća Grada Gospića  
Ana-Marija Zdunić, mag. iur., v.r.

## IZVJEŠĆE

### o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

#### UVOD




- Gradsko vijeće Grada Gospića je na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine donijelo Odluku o Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Sredstva planirana 29. prosinca 2021. godine iznosila su 9.124.276,00 kn.
- Izmjene i dopune programa su donesene temeljem članka 67. stavaka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 – Odluka USRH, 32/20) i članka 179. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21).


Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu sastoji se od 10 točaka:

1. NERAZVRSTANE CESTE
2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
3. JAVNA PARKIRALIŠTA
4. JAVNE ZELENE POVRŠINE
5. JAVNA RASVJETA
6. GROBLJA
7. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIOM OTPADOM
8. PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
9. PROGRAM RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA
10. PROGRAM RAZVOJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

#### 1. NERAZVRSTANE CESTE


Redni broj	Nerazvrstane ceste	A plan za 2021. godinu	B realizacija plana za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
1.1.	Izgradnja ceste na relaciji Vaganac-Kruščica	488.385,00 kn	488.384,43 kn	100,00
1.2.	Izgradnja i/ili rekonstrukcija cesta i mostova	1.578.500,00 kn	1.584.912,92 kn	100,41
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>2.066.885,00 kn</b>	<b>2.073.297,35 kn</b>	<b>100,31</b>
Izvor sredstava za realizaciju		izvori sredstava planirani za 2021. godinu	izvor sredstava realizirani za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
Izvor 5.4. Tekuće pomoći (ŽUC)		10.000,00 kn	45.125,00 kn	451,25
Izvor 5.6. Prijenos sredstava EU		488.385,00 kn	488.384,43 kn	100,00
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći		200.000,00 kn	200.000,00 kn	100,00
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		308.000,00 kn	308.000,00 kn	100,00
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		1.060.500,00 kn	1.031.787,92 kn	97,29
<b>UKUPNI IZVORI</b>		<b>2.066.885,00 kn</b>	<b>2.073.297,35 kn</b>	<b>100,31</b>

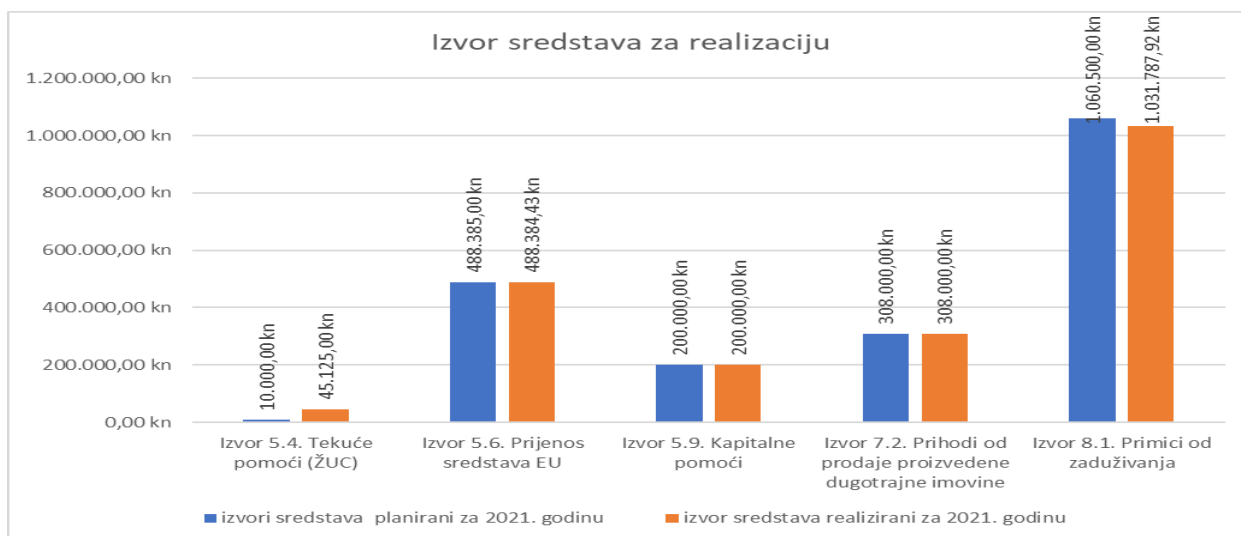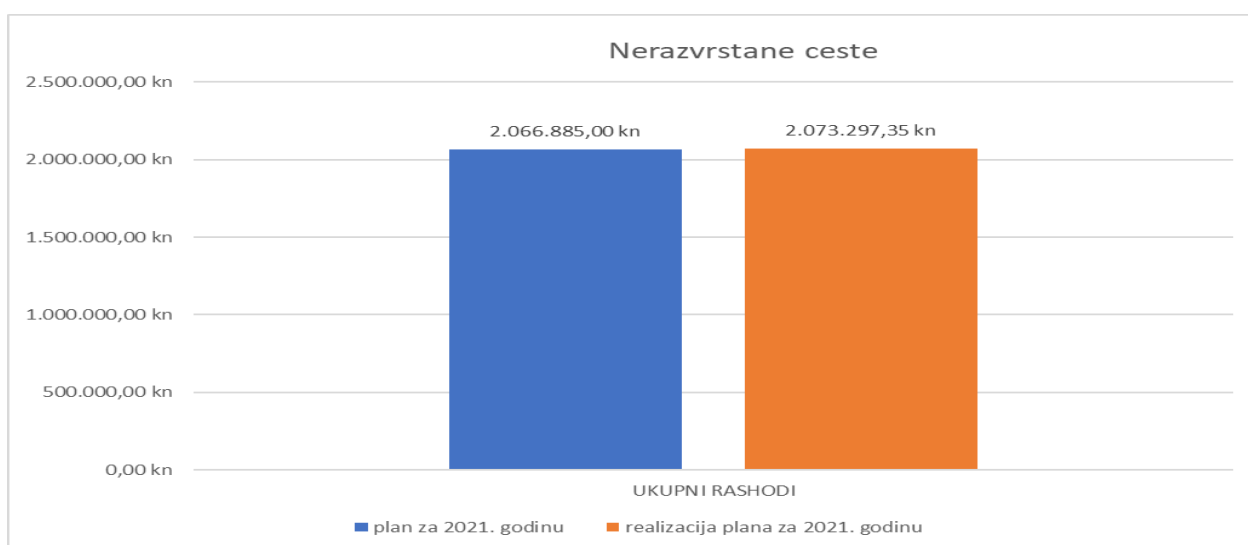
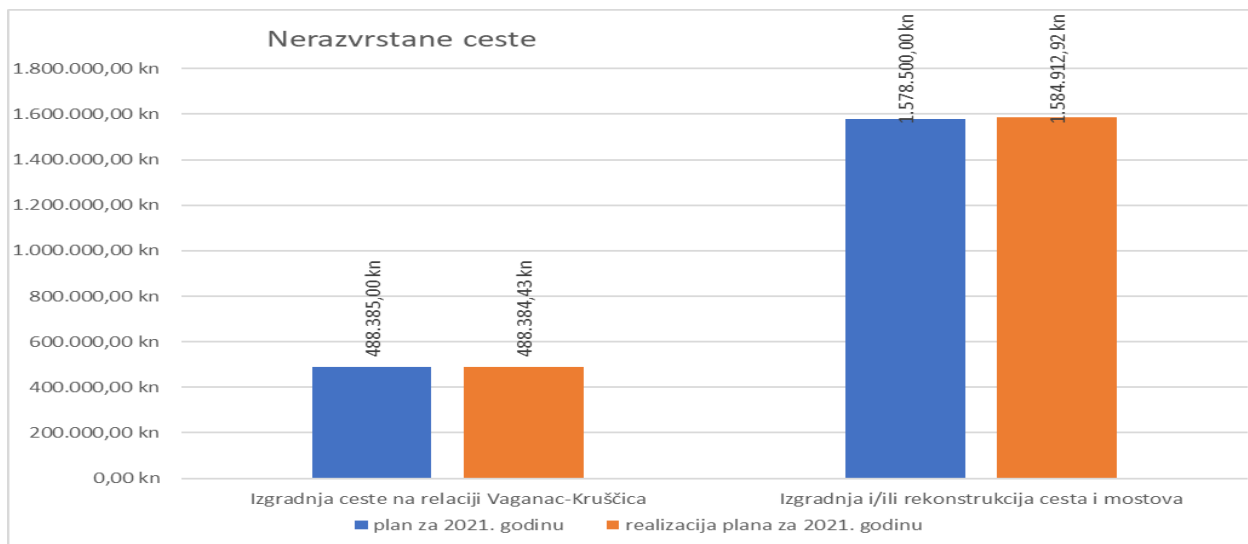


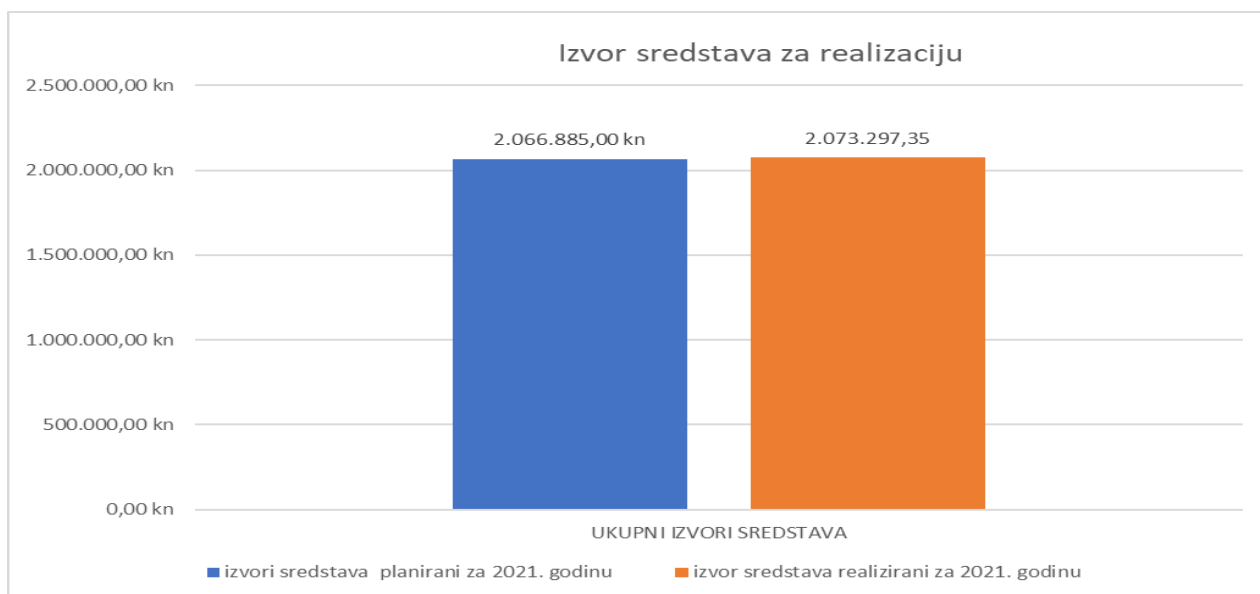

## 2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA



Redni broj	Javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozila	A	B	Indeks (B/A)*100
		plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	
2.1.	Izgradnja Trga Nikola Tesla (KIC)	987.958,00 kn	981.988,10 kn	99,40
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>987.958,00 kn</b>	<b>981.988,10 kn</b>	<b>99,40</b>
Izvor sredstava za realizaciju		izvori sredstava planirani za 2021. godinu	izvor sredstava realizirani za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
	Izvor 4.3. Doprinos za šume	476.214,00 kn	696.590,97 kn	146,28
	Izvor 4.4. Komunalni doprinos	244.285,00 kn	17.938,13 kn	7,34
	Izvor 8.1. Primici od zaduživanja	267.459,00 kn	267.459,00 kn	100,00
<b>UKUPNI IZVORI</b>		<b>987.958,00 kn</b>	<b>981.988,10 kn</b>	<b>99,40</b>

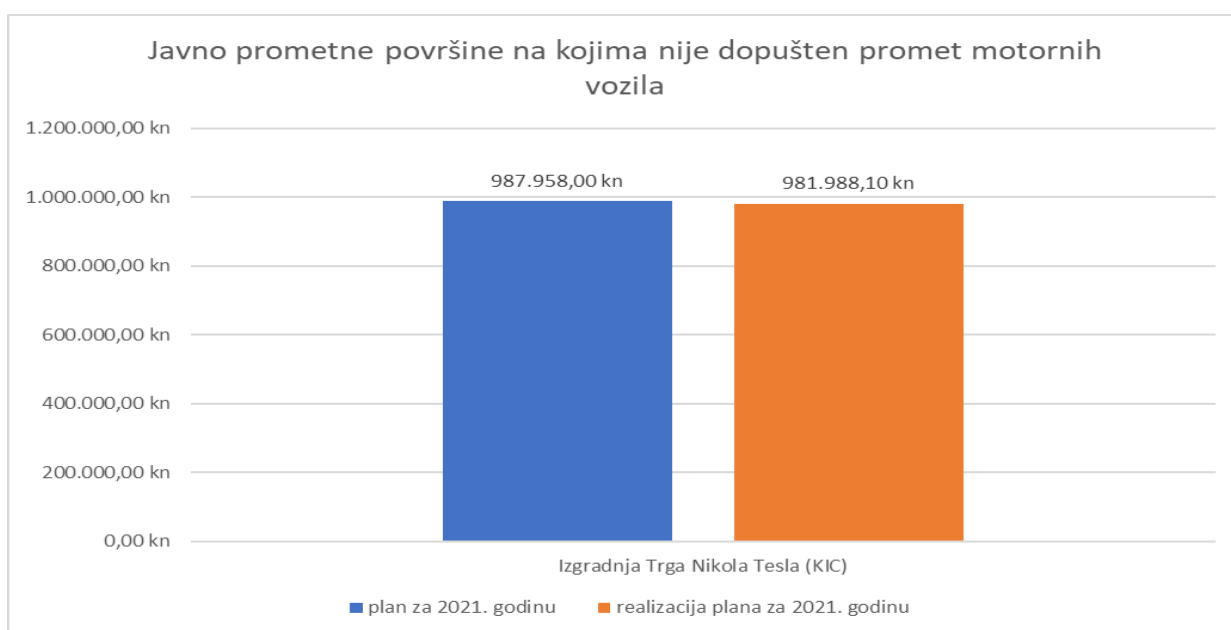

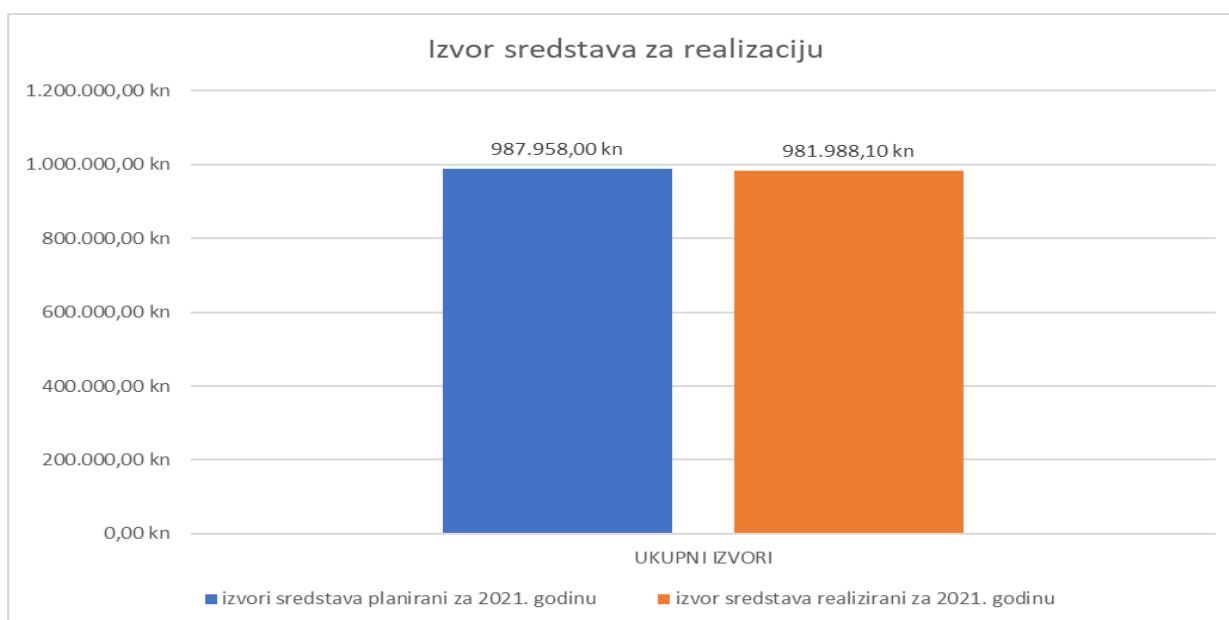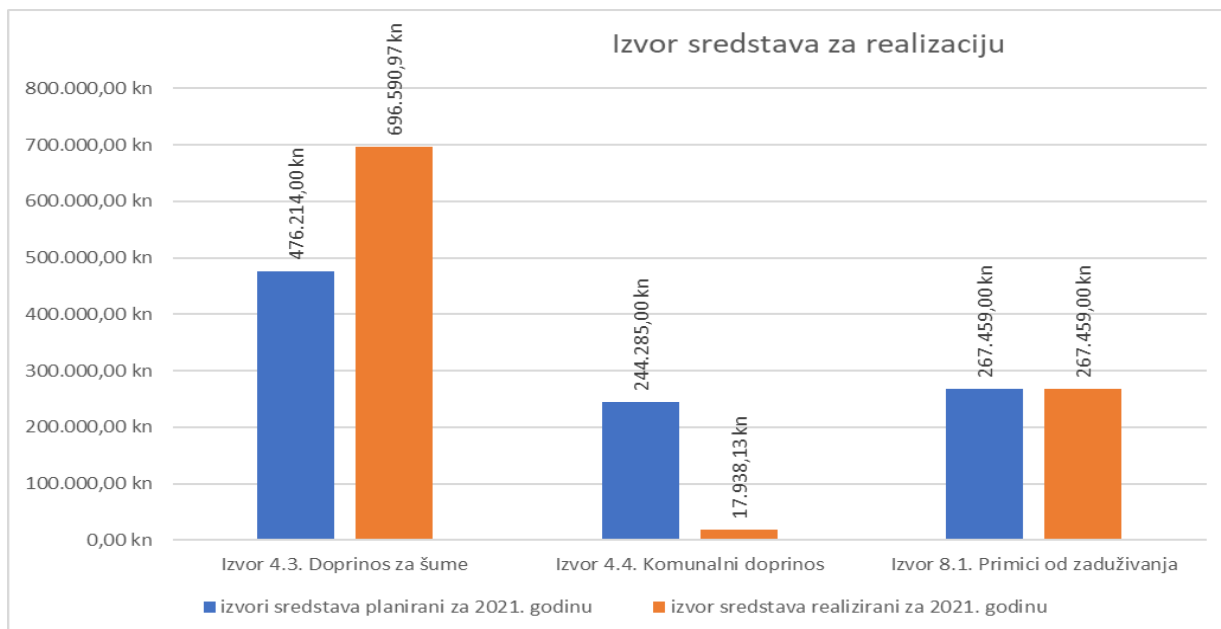




### 3. JAVNA PARKIRALIŠTA

Redni broj	Javna parkirališta	A	B	Indeks (B/A)*100
		plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	
3.1.	Izgradnja parkirališta na Ličkom Osiku (Dom zdravlja – Dječji vrtić)	212.000,00 kn	211.250,00 kn	99,65
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>212.000,00 kn</b>	<b>211.250,00 kn</b>	<b>99,65</b>
<b>Izvor sredstava za realizaciju</b>		<b>izvori sredstava planirani za 2021. godinu</b>	<b>izvor sredstava realizirani za 2021. godinu</b>	<b>Indeks (B/A)*100</b>
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		212.000,00 kn	211.250,00 kn	99,65
<b>UKUPNI IZVORI</b>		<b>212.000,00 kn</b>	<b>211.250,00 kn</b>	<b>99,65</b>

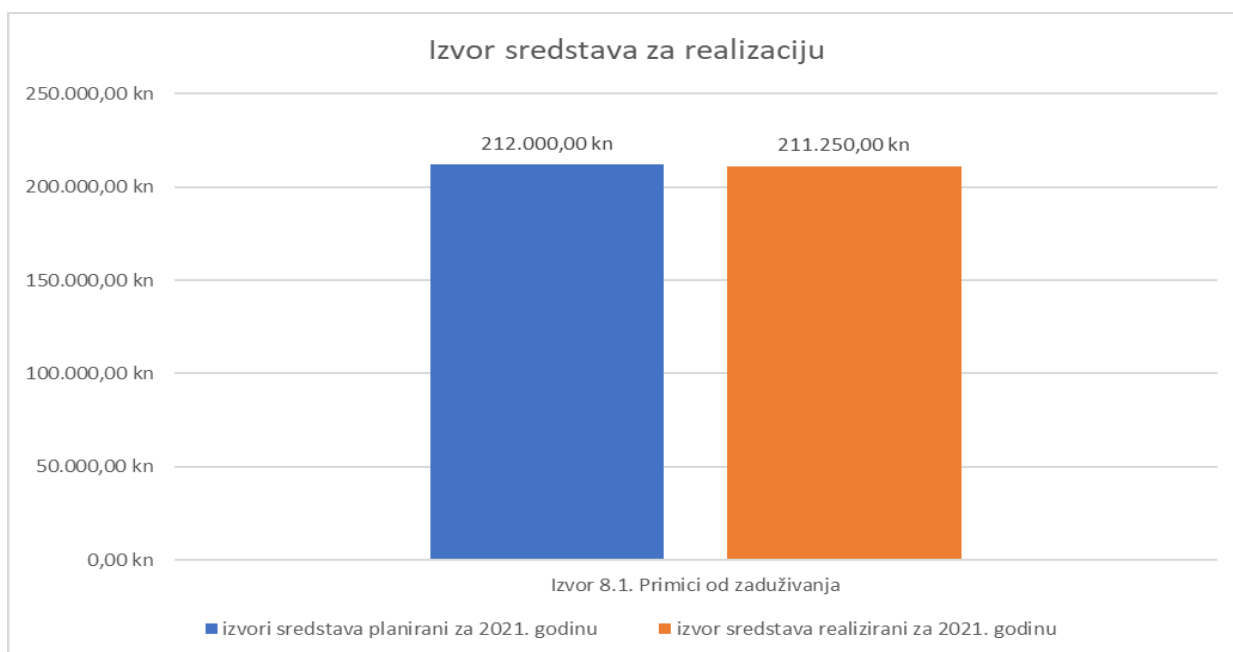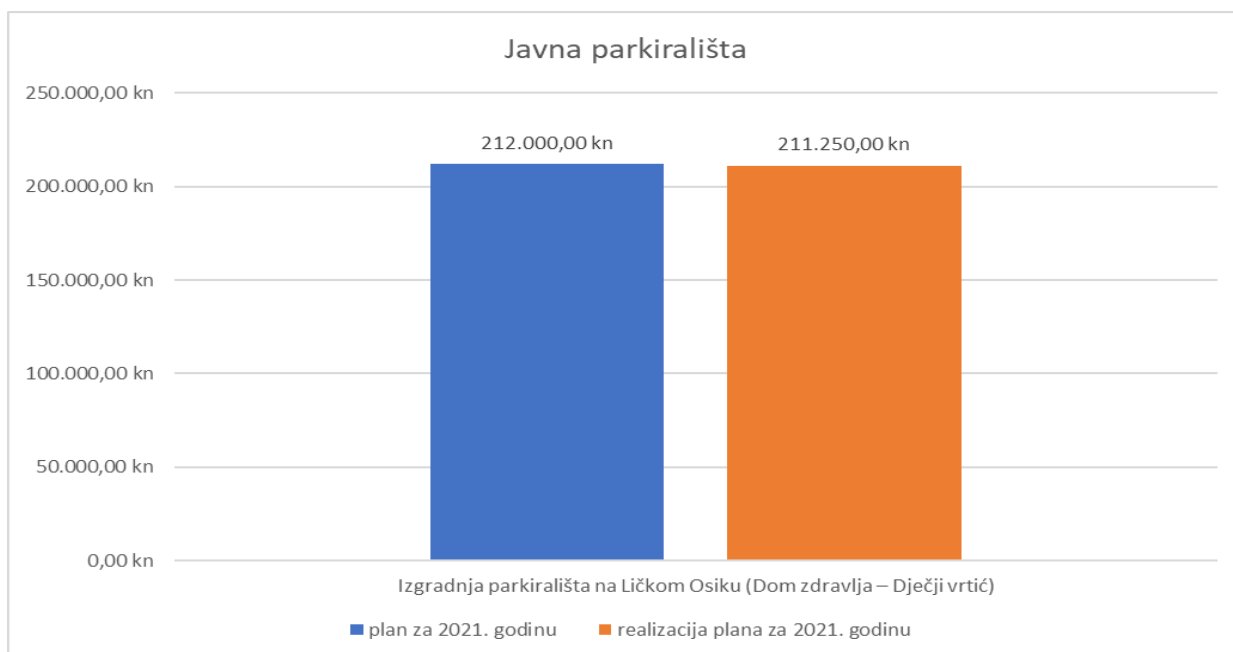


#### 4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Redni broj	Javne zelene površine	A	B	Indeks (B/A)*100
		plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	
4.1.	Izgradnja atletske staze na gradskom stadionu u Gospiću	600.000,00 kn	0,00 kn	0,00
4.2.	Izgradnja dječjih i sportskih igrališta	205.000,00 kn	205.190,00 kn	100,09
4.3.	Oprema za javne površine	75.000,00kn	71.875,00 kn	95,83
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>880.000,00 kn</b>	<b>277.065,00 kn</b>	<b>31,48</b>
<b>Izvor sredstava za realizaciju</b>		<b>izvori sredstava planirani za 2021. godinu</b>	<b>izvor sredstava realizirani za 2021. godinu</b>	<b>Indeks (B/A)*100</b>
Izvor 4.4. Komunalni doprinos		205.000,00 kn	205.190,00 kn	100,09
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći		600.000,00 kn	0,00 kn	0,00
Izvor 7.1. Prihod od prodaje ne proizvedene imovine		75.000,00 kn	71.875,00 kn	95,83
<b>UKUPNI IZVORI</b>		<b>880.000,00 kn</b>	<b>277.065,00 kn</b>	<b>31,48</b>

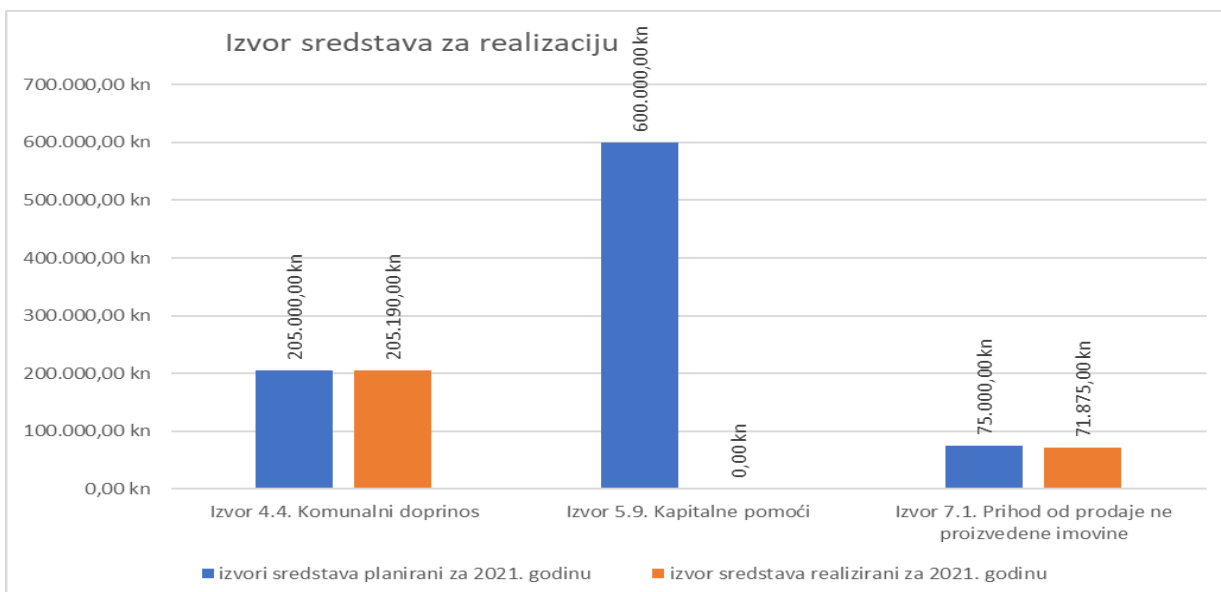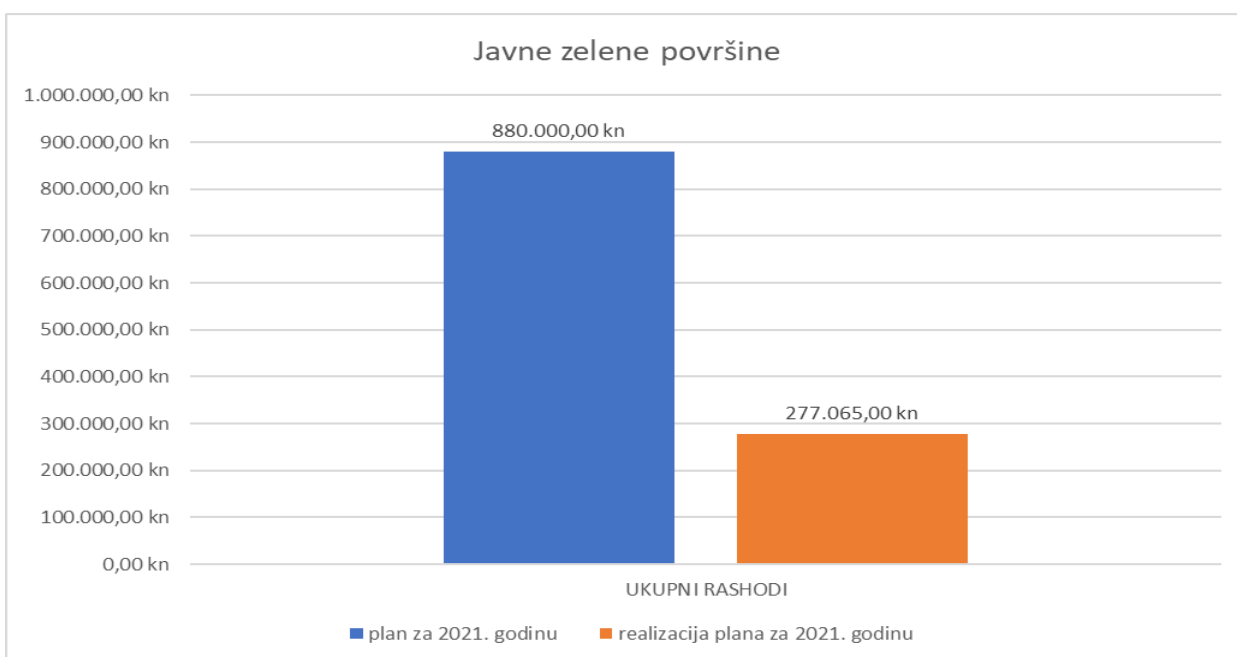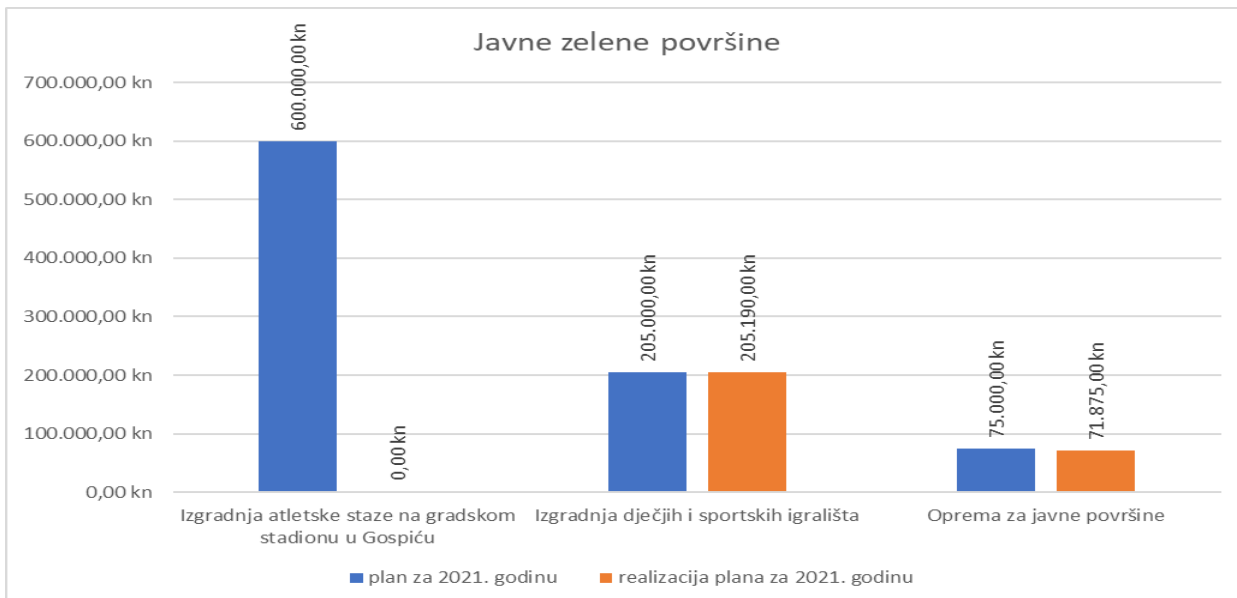




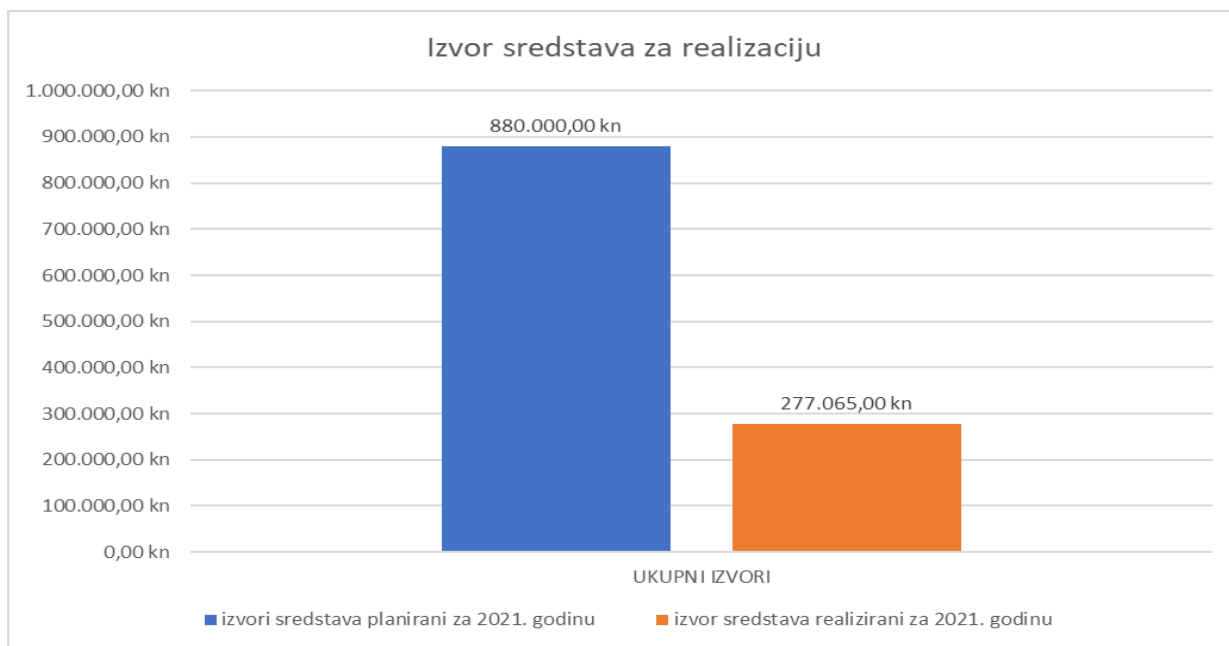

## 5. JAVNA RASVJETA


Redni broj	Javna rasvjeta	A	B	Indeks (B/A)*100
		plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	
5.1.	Izgradnja javne rasvjete po Mjesnim odborima	40.000,00 kn	30.832,50 kn	77,08
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>40.000,00 kn</b>	<b>30.832,50 kn</b>	<b>77,08</b>
<b>Izvor sredstava za realizaciju</b>				
		izvori sredstava planirani za 2021. godinu	izvor sredstava realizirani za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
	Izvor 4.4. Komunalni doprinos	40.000,00 kn	30.832,50 kn	77,08
<b>UKUPNI IZVORI</b>		<b>40.000,00 kn</b>	<b>30.832,50 kn</b>	<b>77,08</b>

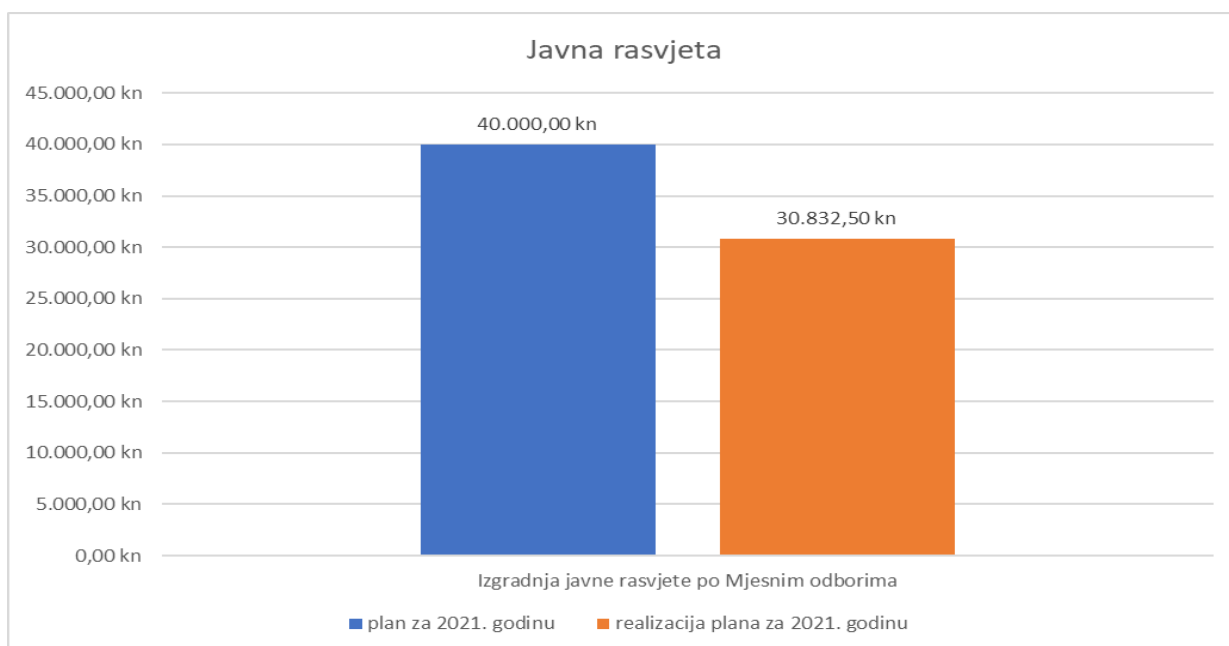




## 6. GROBLJA

Redni broj	Groblja	A	B	Indeks (B/A)*100
		plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	
6.1.	Izgradnja grobnica za branitelje i Memorijalnog centra kao trajno obilježje i rješenje za trajno zbrinjavanje svih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja na području Grada Gospića.	55.000,00 kn	27.323,78 kn	49,68
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>55.000,00 kn</b>	<b>27.323,78 kn</b>	<b>49,68</b>
<b>Izvor sredstava za realizaciju</b>		<b>izvori sredstava planirani za 2021. godinu</b>	<b>izvor sredstava realizirani za 2021. godinu</b>	<b>Indeks (B/A)*100</b>
Izvor 4.3. Doprinos za šume		30.000,00 kn	10.000,00 kn	33,33
Izvor 4.4. Komunalni doprinos		25.000,00 kn	17.323,78 kn	69,30
<b>UKUPNI IZVORI</b>		<b>55.000,00 kn</b>	<b>27.323,78 kn</b>	<b>49,68</b>


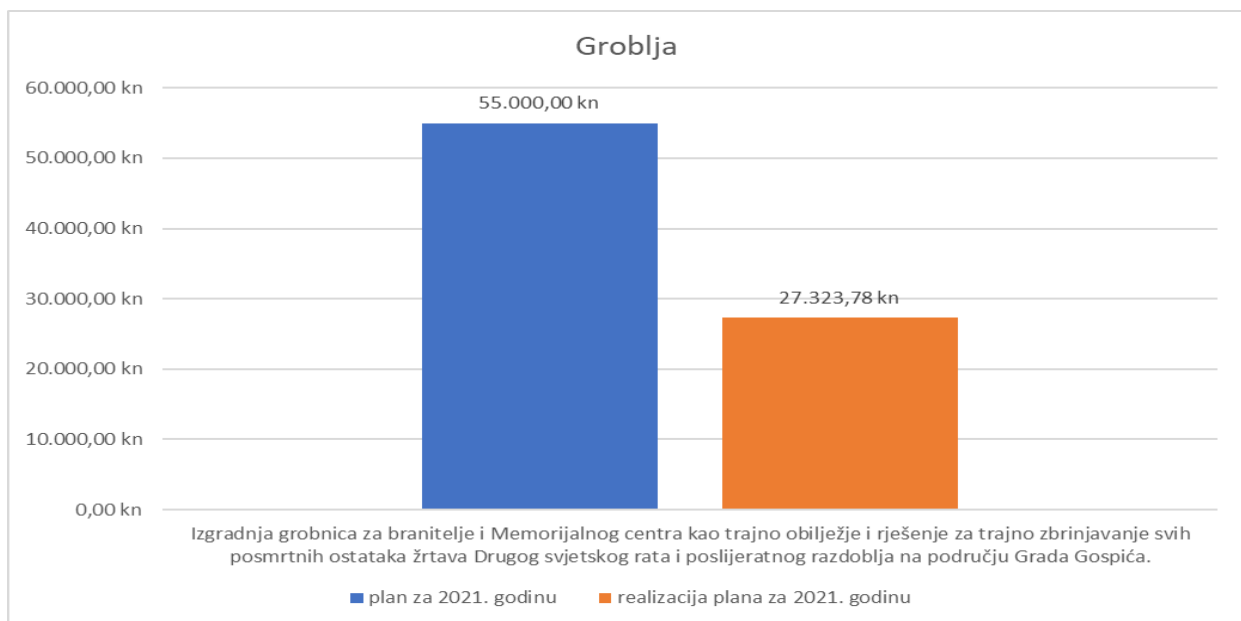



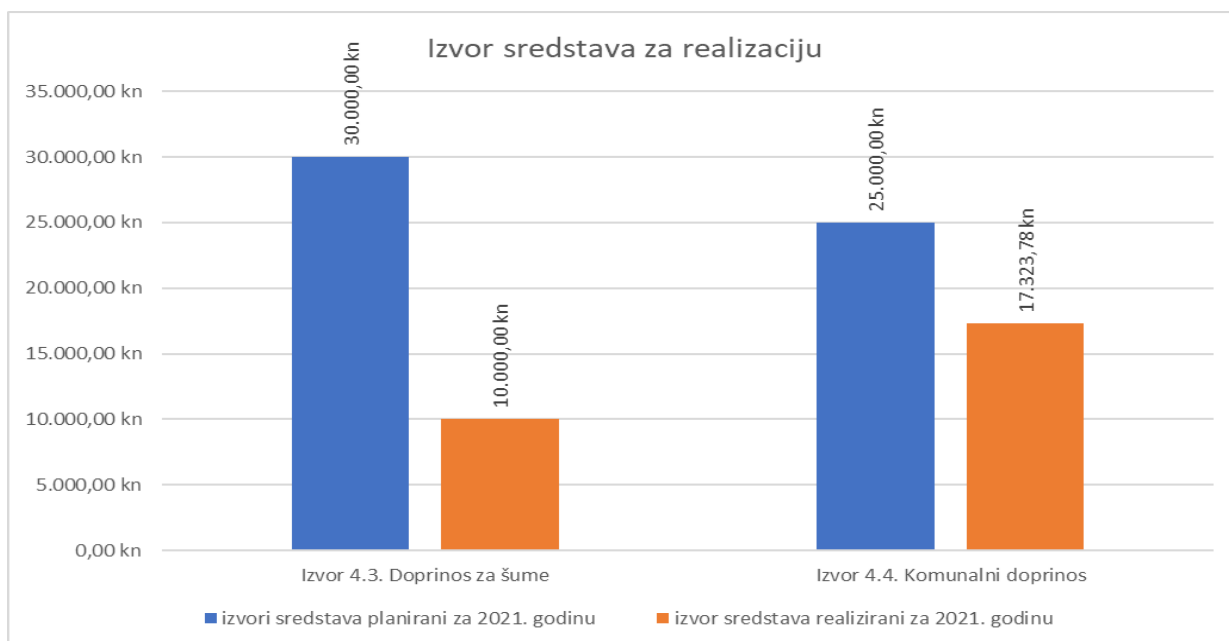


## 7. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIOM OTPADOM

Redni broj	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	A	B	Indeks (B/A)*100
		plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	
7.1.	Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Rakitovac	50.000,00 kn	37.125,00 kn	74,25
7.2.	Izgradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad	431.862,00 kn	777.917,61 kn	180,13
7.3.	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada	175.000,00 kn	174.742,68 kn	99,85
7.4.	Nabava komunalnih vozila i spremnika za prikupljanje komunalnog otpada	500.000,00 kn	500.000,00 kn	100,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>1.156.862,00 kn</b>	<b>1.489.785,29 kn</b>	<b>128,78</b>
<b>Izvor sredstava za realizaciju</b>		<b>izvori sredstava planirani za 2021. godinu</b>	<b>izvor sredstava realizirani za 2021. godinu</b>	<b>Indeks (B/A)*100</b>
Izvor 4.5. Komunalna naknada		29.557,00 kn	33.421,54 kn	113,07
Izvor 5.3. Tekuće pomoći (KOMPENZACIJSKE MJERE)		50.000,00 kn	37.125,00 kn	74,25

Izvor 5.6. Prijenos sredstava EU	0,00 kn	109.071,07 kn	0,00
Izvor 8.1. Primici za zaduživanje	1.077.305,00 kn	1.310.167,68 kn	121,62
<b>UKUPNI IZVORI</b>	<b>1.156.862,00 kn</b>	<b>1.489.785,29 kn</b>	<b>128,78</b>

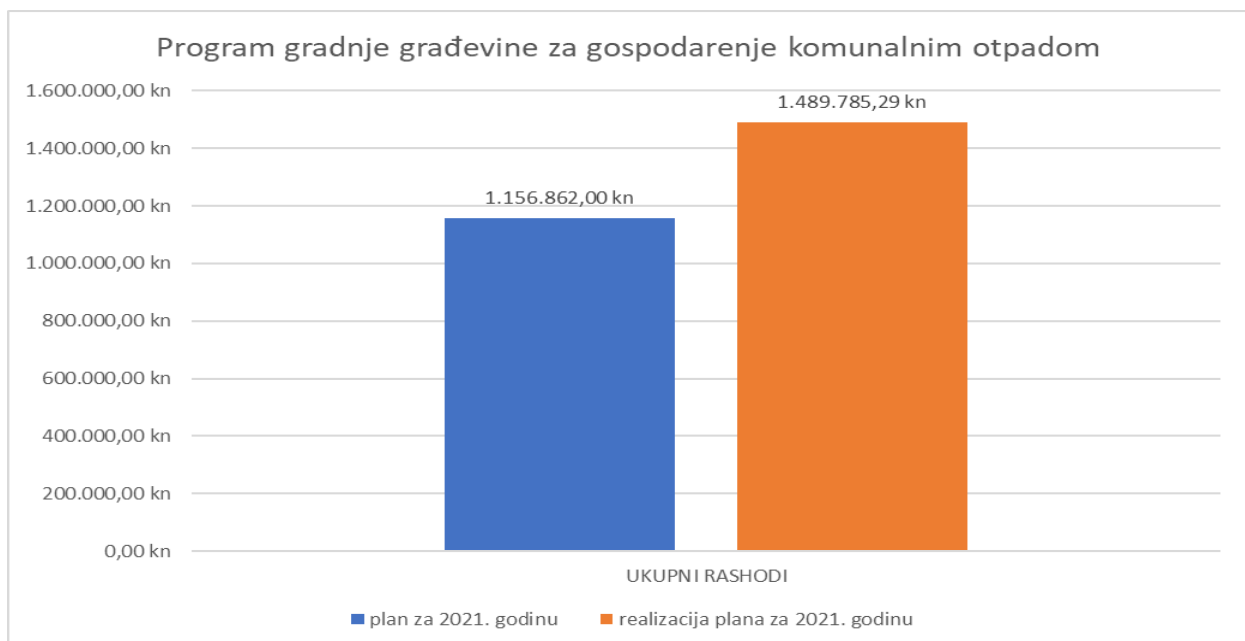
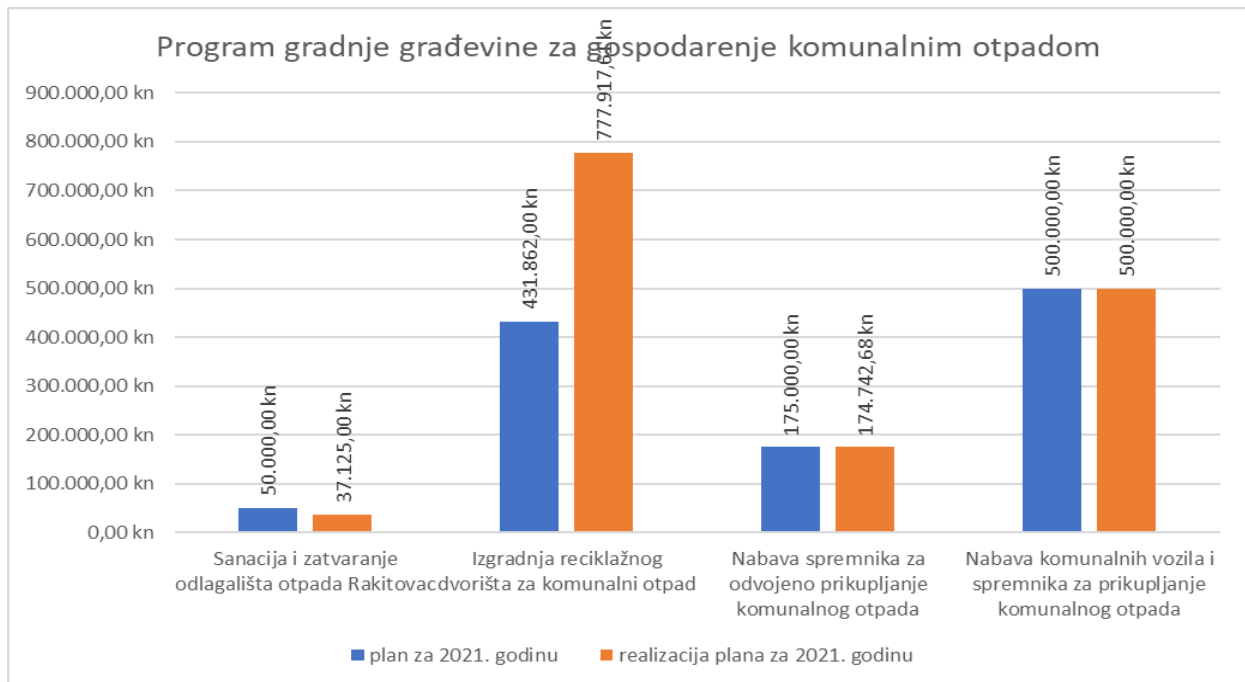


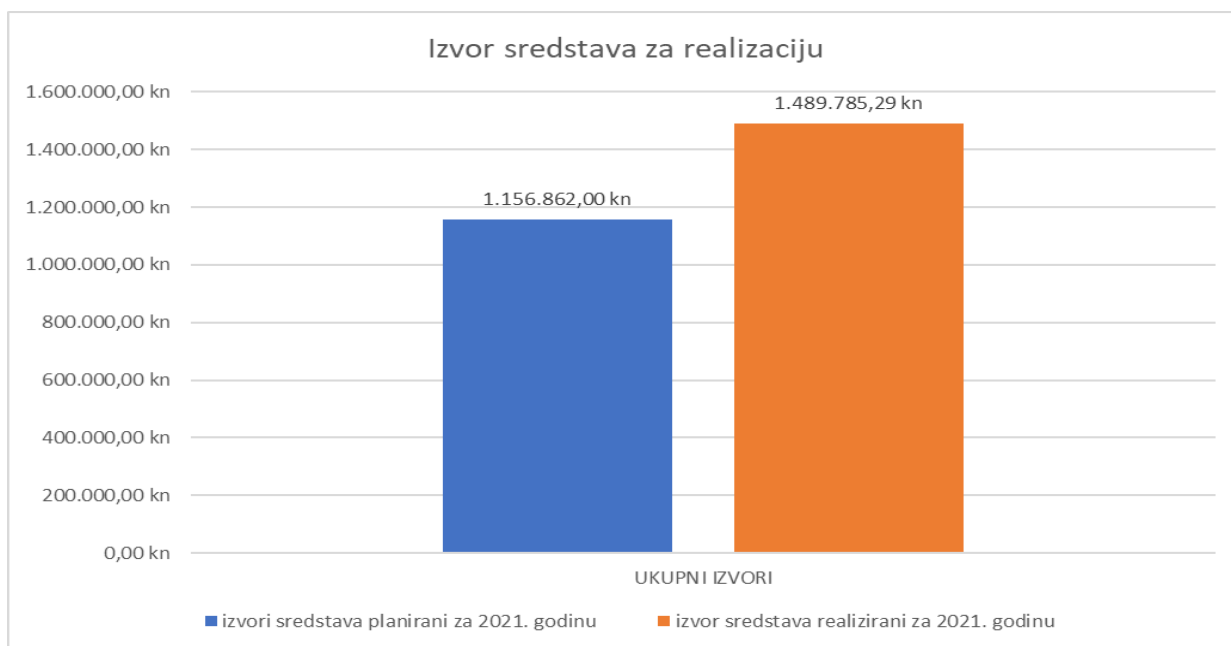
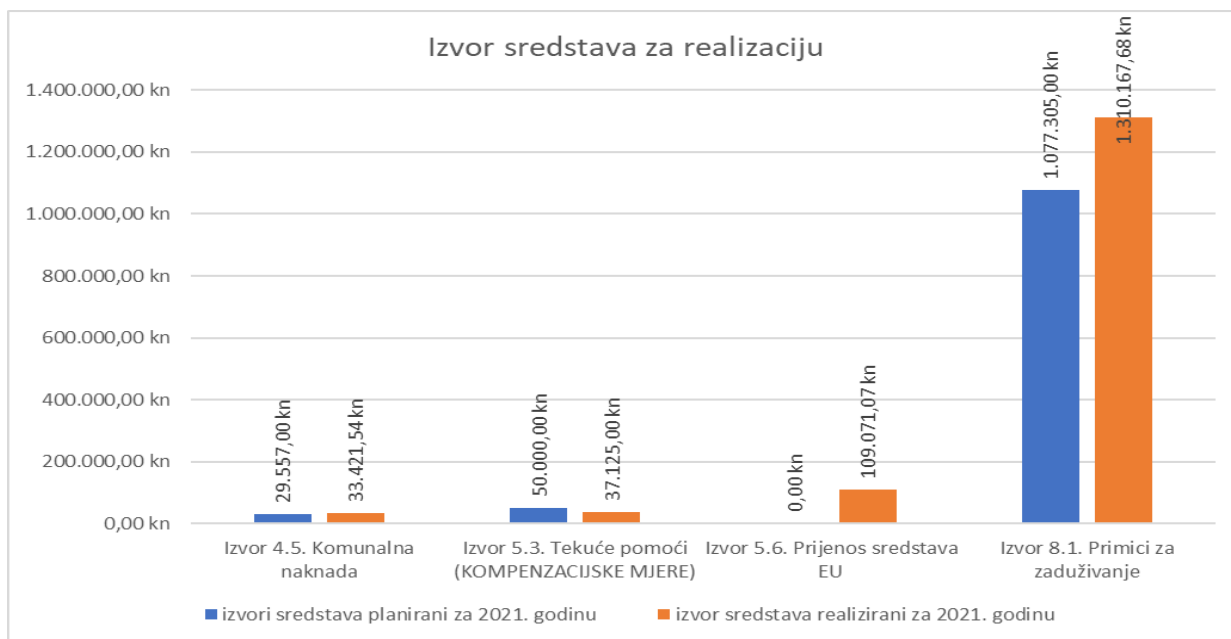


## 8. PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Redni broj	Program energetske učinkovitosti	A	B	Indeks (B/A)*100
		plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	
8.1.	Energetska obnova zgrade Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana na Ličkom Osiku.	1.986.938,00 kn	1.986.936,34	100,00
8.2.	Sufinanciranje kamata za energetske učinkovitost stambenih zgrada	40.000,00 kn	12.961,67 kn	32,40
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>2.026.938,00 kn</b>	<b>1.999.898,01 kn</b>	<b>98,67</b>
<b>Izvor sredstava za realizaciju</b>		<b>izvori sredstava planirani za 2021. godinu</b>	<b>izvor sredstava realizirani za 2021. godinu</b>	<b>Indeks (B/A)*100</b>
Izvor 1.1. Prihod od poreza		40.000,00 kn	12.961,67 kn	32,40



Izvor 4.5. Komunalna naknada	12.057,00 kn	397.132,35 kn	3.293,79
Izvor 5.6. Prijenos sredstava EU	815.800,00 kn	566.339,84 kn	69,42
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja	1.159.081,00 kn	1.023.464,15 kn	88,30
<b>UKUPNI IZVORI</b>	<b>2.026.938,00 kn</b>	<b>1.999.898,01 kn</b>	<b>98,67</b>

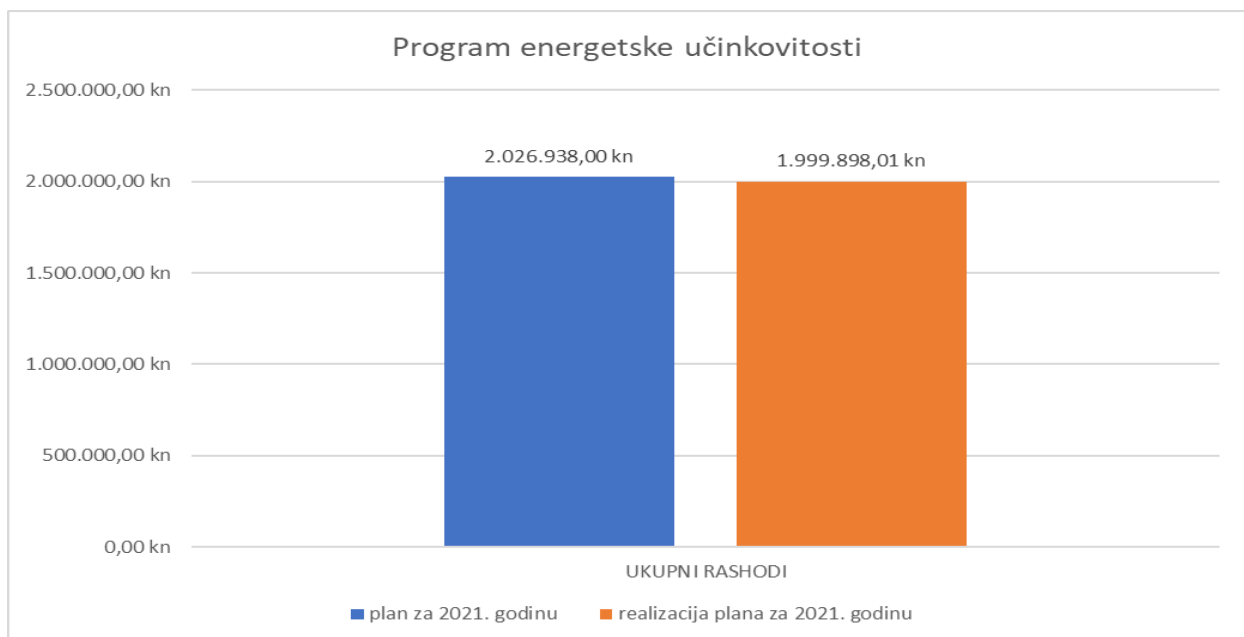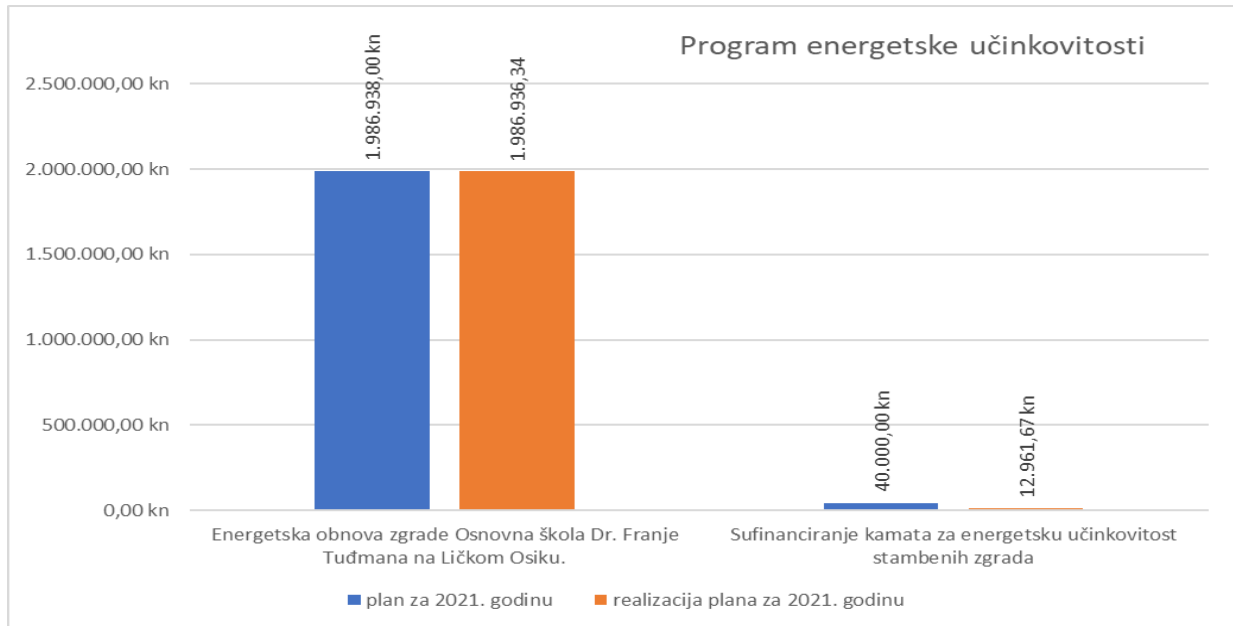

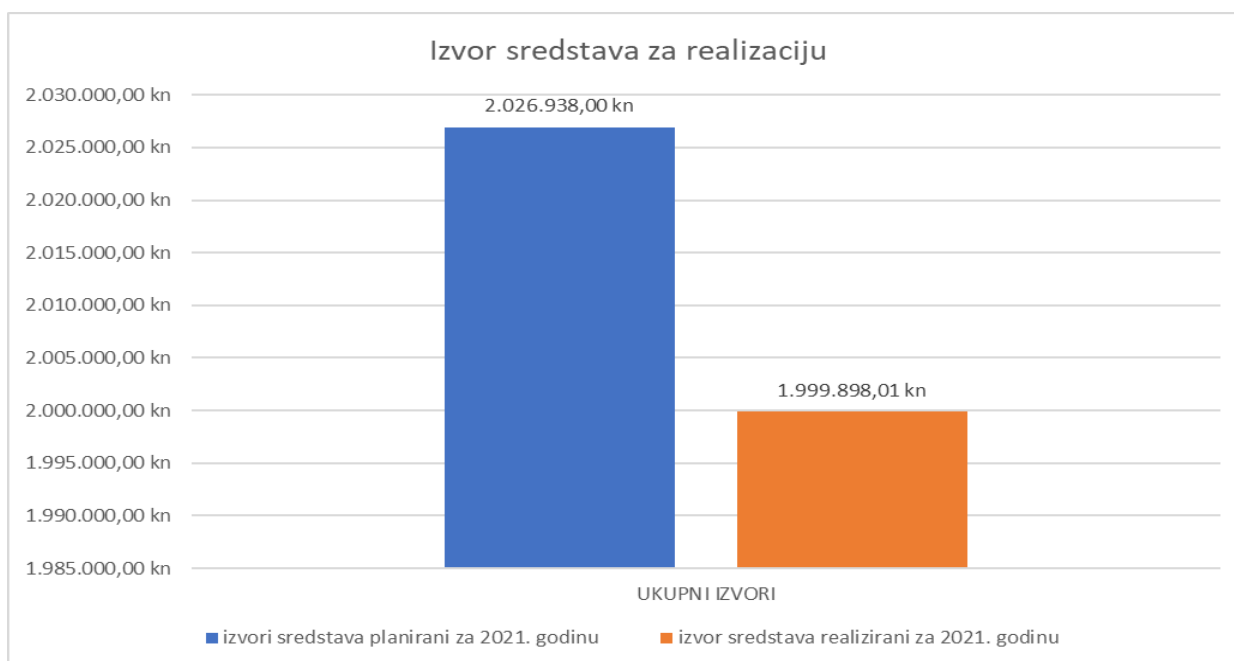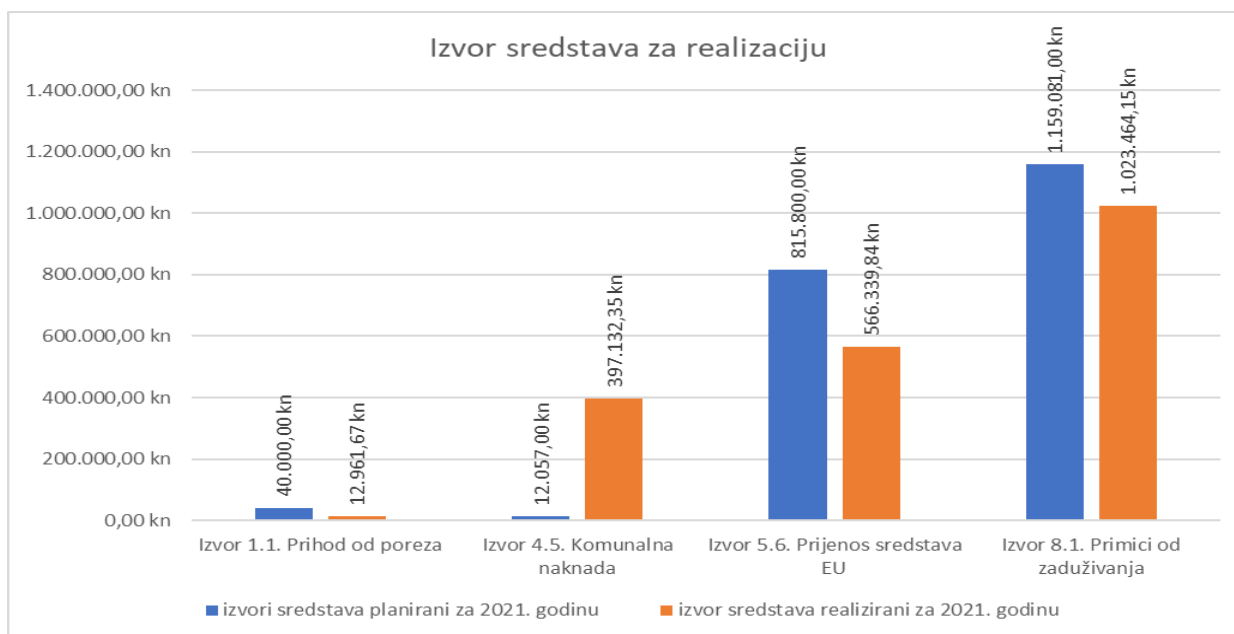


## 9. PROGRAM RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA

Redni broj	Program razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta	A	B	Indeks (B/A)*100
		plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	
9.1.	Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta (PRŠI)	890.641,00 kn	687.913,75 kn	77,24
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>890.641,00kn</b>	<b>687.913,75 kn</b>	<b>77,24</b>
<b>Izvor sredstava za realizaciju</b>		<b>izvori sredstava planirani za 2021. godinu</b>	<b>izvor sredstava realizirani za 2021. godinu</b>	<b>Indeks (B/A)*100</b>
Izvor 5.6. Prijenos sredstava EU		755.580,00 kn	540.230,04 kn	71,50
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći		18.745,00 kn	0,00	0,00
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		116.316,00 kn	147.683,71 kn	126,97
<b>UKUPNI IZVORI</b>		<b>890.641,00 kn</b>	<b>687.913,75 kn</b>	<b>77,24</b>

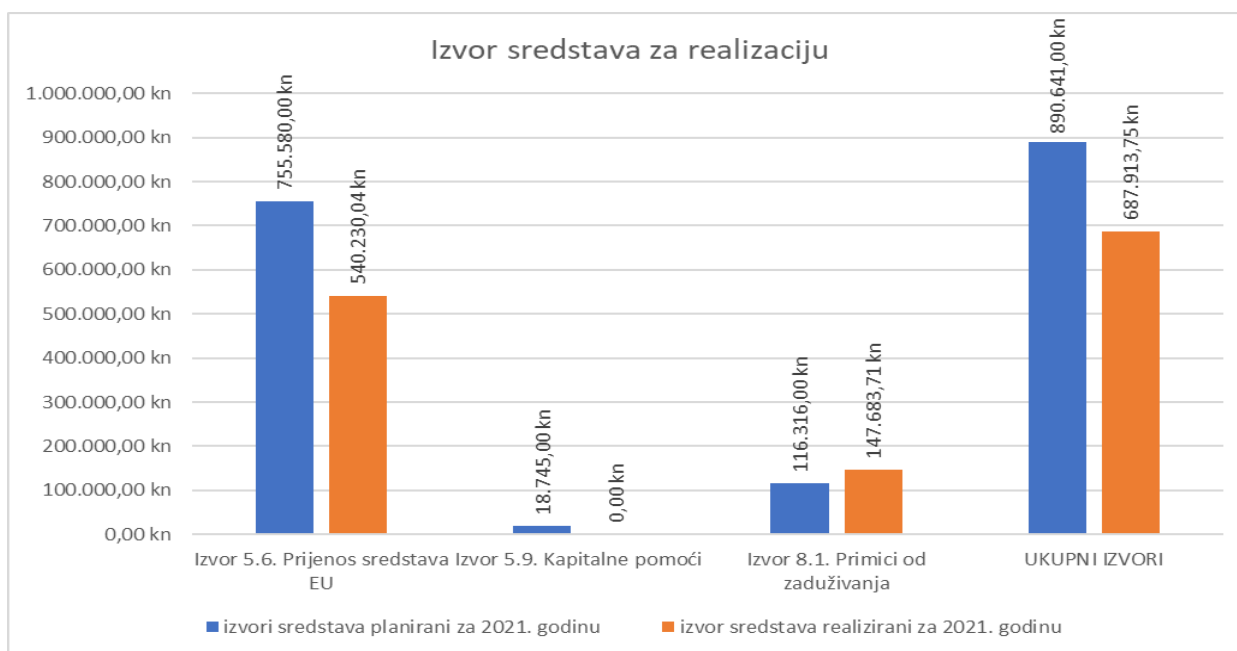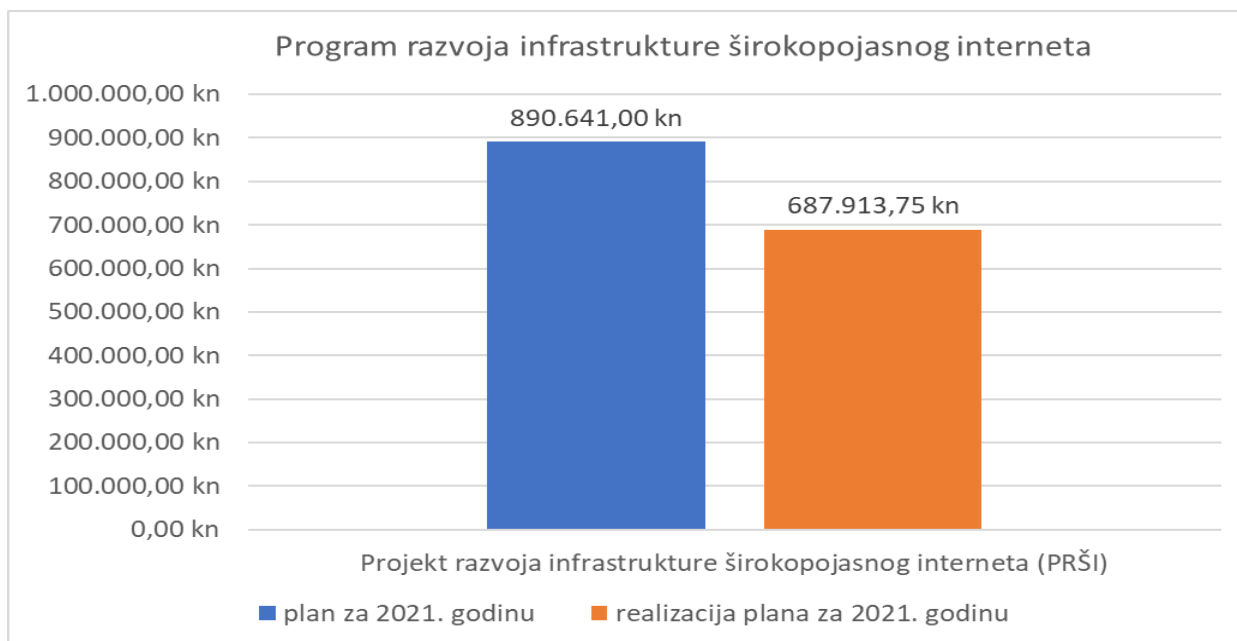




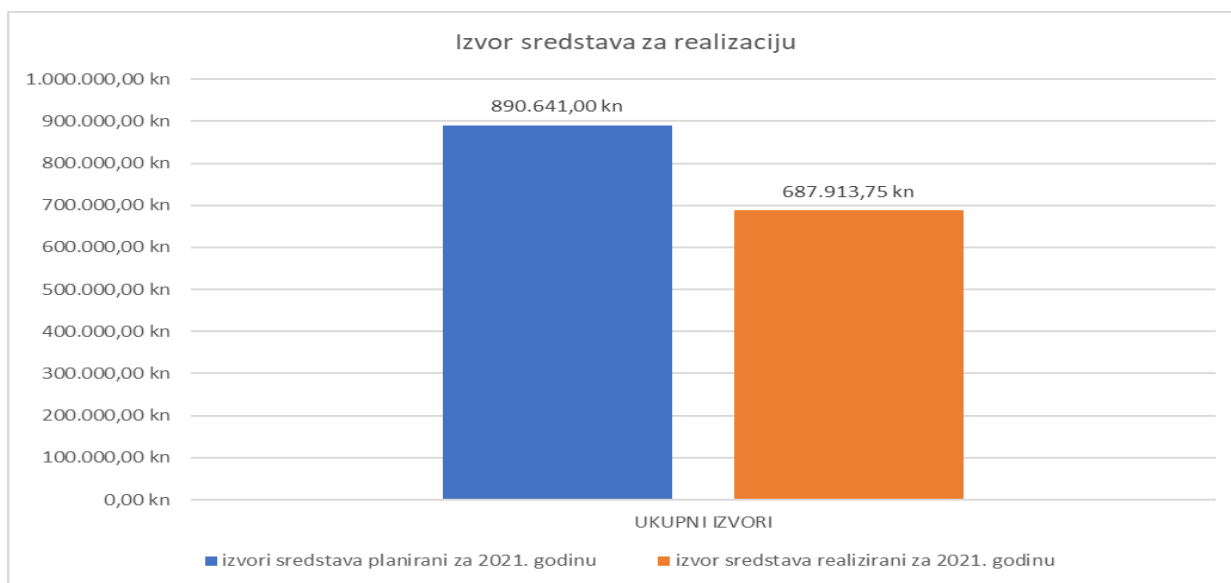


## 10. PROGRAM RAZVOJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Redni broj	Program razvoja vodoopskrbe i odvodnje	A	B	Indeks (B/A)*100
		plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	
10.1.	Sufinanciranje građevina za razvoj vodoopskrbe i odvodnje	199.820,00 kn	143.070,00 kn	71,60
10.2.	Aglomeracija Gospić – Lički Osik - Perušić	608.172,00 kn	608.172,01 kn	100,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>807.992,00 kn</b>	<b>751.242,01 kn</b>	<b>92,98</b>
<b>Izvor sredstava za realizaciju</b>				
		<b>izvori sredstava planirani za 2021. godinu</b>	<b>izvor sredstava realizirani za 2021. godinu</b>	<b>Indeks (B/A)*100</b>
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		807.992,00 kn	751.242,01 kn	92,98
<b>UKUPNI IZVORI</b>		<b>807.992,00 kn</b>	<b>751.242,01 kn</b>	<b>92,98</b>

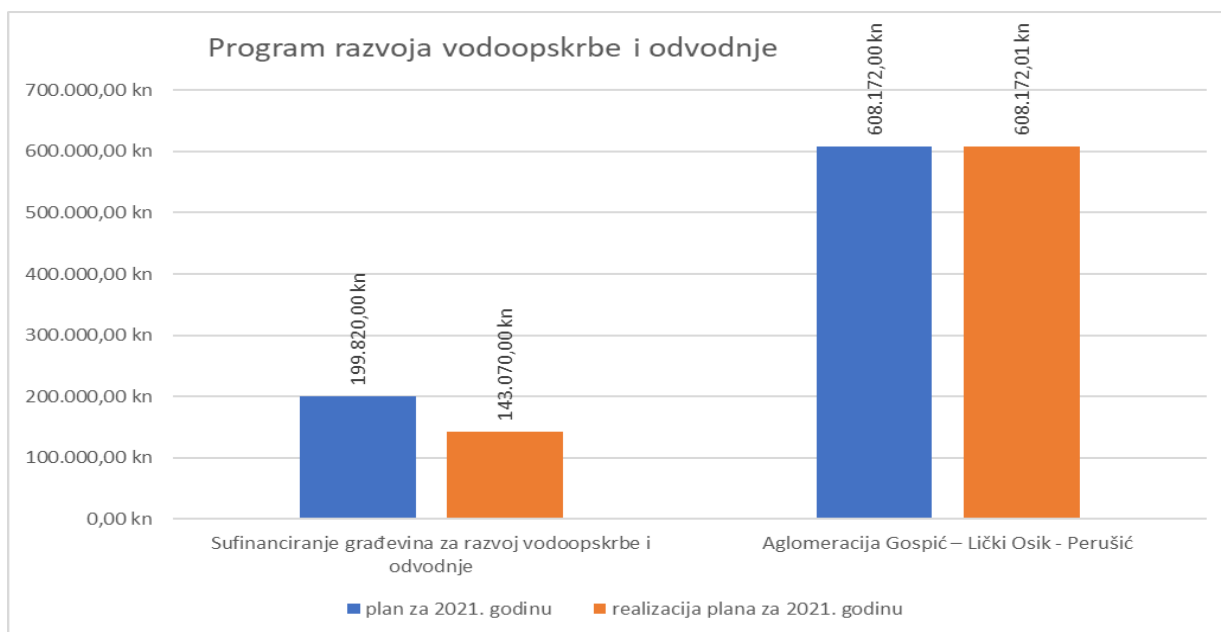



NAZIV	A	B	Indeks (B/A)*100
	plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
NERAZVRSTANE CESTE	2.066.885,00 kn	2.073.297,35 kn	100,31
	plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	987.958,00 kn	981.988,10 kn	99,40
	plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
JAVNA PARKIRALIŠTA	212.000,00 kn	211.250,00 kn	99,65
	plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
JAVNE ZELENE POVRŠINE	880.000,00 kn	277.065,00 kn	31,48
	plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
JAVNA RASVJETA	40.000,00 kn	30.832,50 kn	77,08
	plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
GROBLJA	55.000,00 kn	27.323,78 kn	49,68
	plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIOM OTPADOM	1.156.862,00 kn	1.489.785,29 kn	128,78
	plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.026.938,0 kn	1.999.898,01 kn	98,67
	plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
PROGRAM RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA	890.641,00 kn	687.913,75 kn	77,24
	plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
PROGRAM RAZVOJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	807.992,00 kn	751.242,01 kn	92,98
	plan za 2021. godinu	realizacija plana za 2021. godinu	Indeks (B/A)*100
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>9.124.276,00 kn</b>	<b>8.630.595,79 kn</b>	<b>94,59</b>

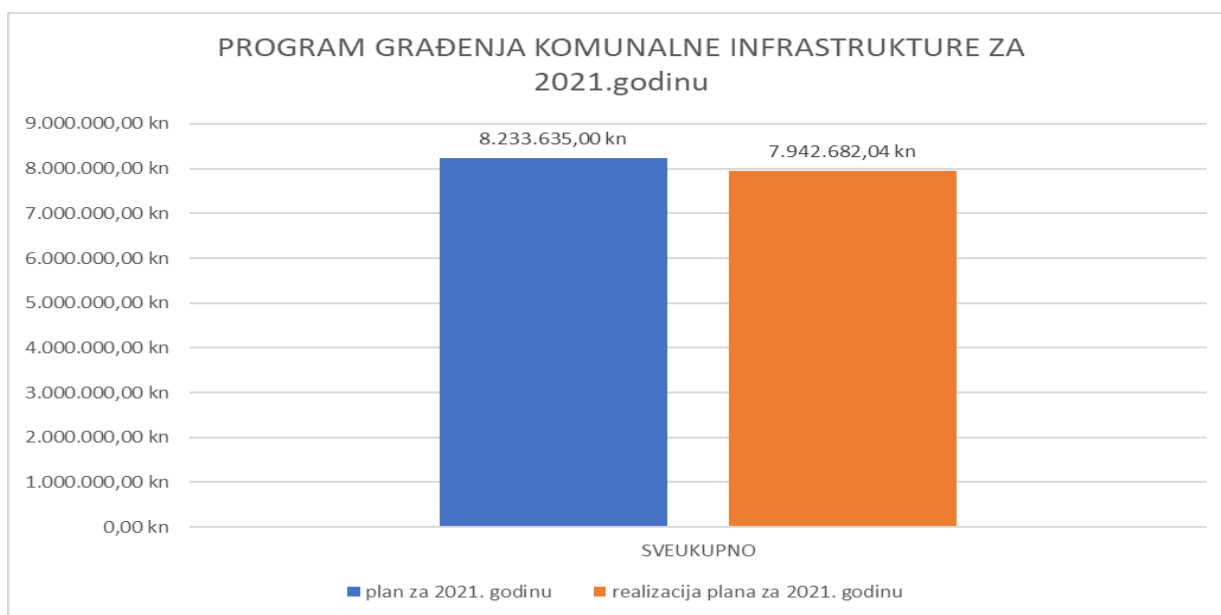

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu 9.124.276,00 kuna na području Grada Gospića i to za: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine, javnu rasvjetu, groblja, gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, program energetske učinkovitosti, program razvoja širokopojasnog interneta i program razvoja vodoopskrbe i odvodnje.

Od planiranih 9.124.276,00 kuna u razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine za: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine, građevine i uređaje javne namjene, javnu rasvjetu, groblja, gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, program energetske učinkovitosti, program razvoja širokopojasnog interneta i program razvoja vodoopskrbe i odvodnje za 2021. godinu utrošeno je 8.630.595,79 kunu ili 94,59 %, u odnosu na planirana sredstva.

**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**izvršenja Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu**

- NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste. Za program nerazvrstane ceste utrošeno je 2.073.297,35 kn. Ovim programom dovršen je projekt izgradnje ceste na relaciji Vaganac – Kruščica kojom je znatno poboljšan životni standard mještana, izgradnja ceste doprinosi razvitku turizma na jezeru Kruščica i oko njega, a posebno ribolovnog turizma.

Jedan dio sredstava je utrošen na kupnju zemljišta za gradnju nove ceste. Sredstva utrošena na dovršenje projekta izgradnja ceste na relaciji Vaganac – Kruščica su iznosila 488.384,43 kn. Ostala sredstva namijenjena programu izgradnje nerazvrstanih cesta utrošena su za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kupnju zemljišta za izgradnju cesta i dr.

- JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Projekt izgradnje trga Nikola Tesla (KIC) na lokaciji ispred Kulturno Informativnog Centra u Gospiću je završen. U ovoj fazi radova utrošeno je 981.988,10 kn. Ovim projektom kao što su to učinile mnoge zemlje i gradovi, Nikoli Tesli se je odalo veliko priznanje i zaslužena čast, a i promovirano je bogato znanstveno i kulturno nasljeđe Gospića i Hrvatske.

- JAVNA PARKIRALIŠTA

Za izgradnju parkirališta na Ličkom Osiku utrošeno je 211.250,00 kn. Izgradnja parkirališta od iznimne je važnosti za lokalno stanovništvo koje se koristi uslugama doma zdravlja, ljekarne i dječjeg vrtića.

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

Radovi na izgradnji atletske staze na gradskom stadionu u Gospiću su počeli. Odrađeni su zemljani radovi, odvodnja, nasipi i dr. Realizacijom ovog projekta izgradit će se i unaprijediti sportska infrastruktura, stvorit će se uvjeti za trening osnovnih atletskih sportova te će se dodatno razviti sustav razvoja sporta u Gospiću, ali i šire zajednice. Projektom se također potiče zdrav način života i aktivno bavljenje sportom svih građana, a posebno mladih sportskih talenata.

- GROBLJA

Izgrađena je grobnica kao trajno obilježje i rješenje za trajno zbrinjavanje svih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja na području Grada Gospića.

- GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada Rakitovac utrošeno je 37.125,00 kn. Za izgradnju reciklažnog dvorišta za komunalni otpad utrošeno je 777.917,61 kn. Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada utrošeno je 174.742,68 kn. Svrha nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada je nadopunjavanje postojeće količine spremnika firme Komunalac Gospić d.o.o.. Cilj je postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila na području Grada Gospića. Nabavom dovoljnih količina komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada ostvarili bi primarni cilj odvojenog prikupljanja otpada, a to je što više izdvojiti iskoristivog otpada s ciljem recikliranja. Za nabavu komunalnih vozila utrošeno je 500.000,00 kn. Nabavom novih komunalnih vozila poboljšana je vozni park Komunalca Gospić d.o.o.

- PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Projekt energetska obnova zgrade Osnove škole Dr. Franje Tuđmana na Ličkom Osiku u cijelosti je završen. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.404.144,99 kn, od čega je 2.808.425,25 kn financirano sredstvima kredita, 2.042.320,23 kn je financirano iz EU sredstava, a ostatak je financirao Grad Gospić. Projektom su provedene 4 mjere energetske učinkovitosti vanjska ovojnica, strop prema negrijanom prostoru, stropovi prema tavanu, zamjena kotla na biomasu i zamjena rasvjetnih tijela. Provedbom navedenih mjera očekuje se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 791.605,92 kWh i smanjenje CO<sub>2</sub> za 190 t/god te se koriste obnovljivi izvori energije.

- PROGRAM RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA

Projektom Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u NGA bijelim područjima sve 3 jedinice lokalne samouprave: Gradu Gospiću, Gradu Otočcu i Općini Plitvička Jezera. NGA mreže predstavljaju osnovni infrastrukturni preduvjet za povećanje intenziteta i kvalitete korištenja suvremenih usluga i aplikacija temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama kod privatnih korisnika (kućanstava), poslovnih korisnika i javnih korisnika. Projektom se osiguravaju preduvjeti za daljnji društveni i gospodarski razvoj Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera. Projekt se provodi unutar Okvirnog nacionalnog programa razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 97.966.788,40 kn, dok ukupno prihvatljivi troškovi iznose 95.166.788,40 kn. Traženi udio sufinanciranja prihvatljivih troškova iz OPKK iznosi 78,91%, dok će preostali iznos prihvatljivih troškova (21,09%) i neprihvatljive troškove osigurati Grad Gospić. U ovoj fazi projekta utrošeno je 687.913,75 kn, sredstva su utrošena na projektiranje (potpisan je ugovor), konzultantske usluge i izradu web stranice.

- PROGRAM RAZVOJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

U okviru projekta Aglomeracija Gospić – Lički Osik – Perušić obrađuje se problematika odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te vodoopskrbe na području aglomeracije Gospić sve s osnovnim ciljem zaštite zdravstvenog stanja i poboljšanja uvjeta života postojećih i novo priključenih stanovnika na sustav odvodnje na predmetnom području, te smanjenje postojećih gubitaka vode i povećanje sigurnosti vodoopskrbe. Projektom se predviđa spajanje tri postojeće aglomeracije (Gospić – Lički Osik – Perušić) u jedinstvenu aglomeraciju. Za spajanje aglomeracija potrebno je izgraditi 8,5 km gravitacijskih cjevovoda, 3,8 km tlačnih cjevovoda te 11 crpnih stanica. Predviđena je i dogradnja postojećeg sustava odvodnje u duljini cca 18 km gravitacijskih cjevovoda, te 4,9 km tlačnih cjevovoda i izgradnja 17 crpnih stanica. U Gospiću rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje i to 2,3 km metodom bez iskopa, te rekonstrukcija metodom s iskopom 723 m mješovite odvodnje i rekonstrukcije 579 m sanitarno fekalne odvodnje.

Cilj ovog projekta je unaprjeđenje vodno komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić – Lički Osik – Perušić. Generalno se može reći da ciljeve ovog projekta možemo promatrati kao osiguranje odgovarajućih usluga odvodnje i vodoopskrbe proširenjem i rekonstrukcijom postojeće mreže. Ciljevi ovoga projekta su i poboljšanje i zaštita kakvoće vodnih cjelina za koje se očekuje da će se ostvariti proširenjem i rekonstrukcijom sustava odvodnje, te dogradnjom i povećanjem kapaciteta uređaja za pročišćavanje voda u Gospiću na viši stupanj pročišćavanja. U sklopu projekta Aglomeracija Gospić – Lički Osik – Perušić Grad tijekom 2021. godine utrošena sredstva su iznosila 608.172,01 kn. Sredstva su utrošena za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
